

RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ


IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE
OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE
CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO




Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 21/07/2026
Quinzena Vigente 26Q15

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	✔
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

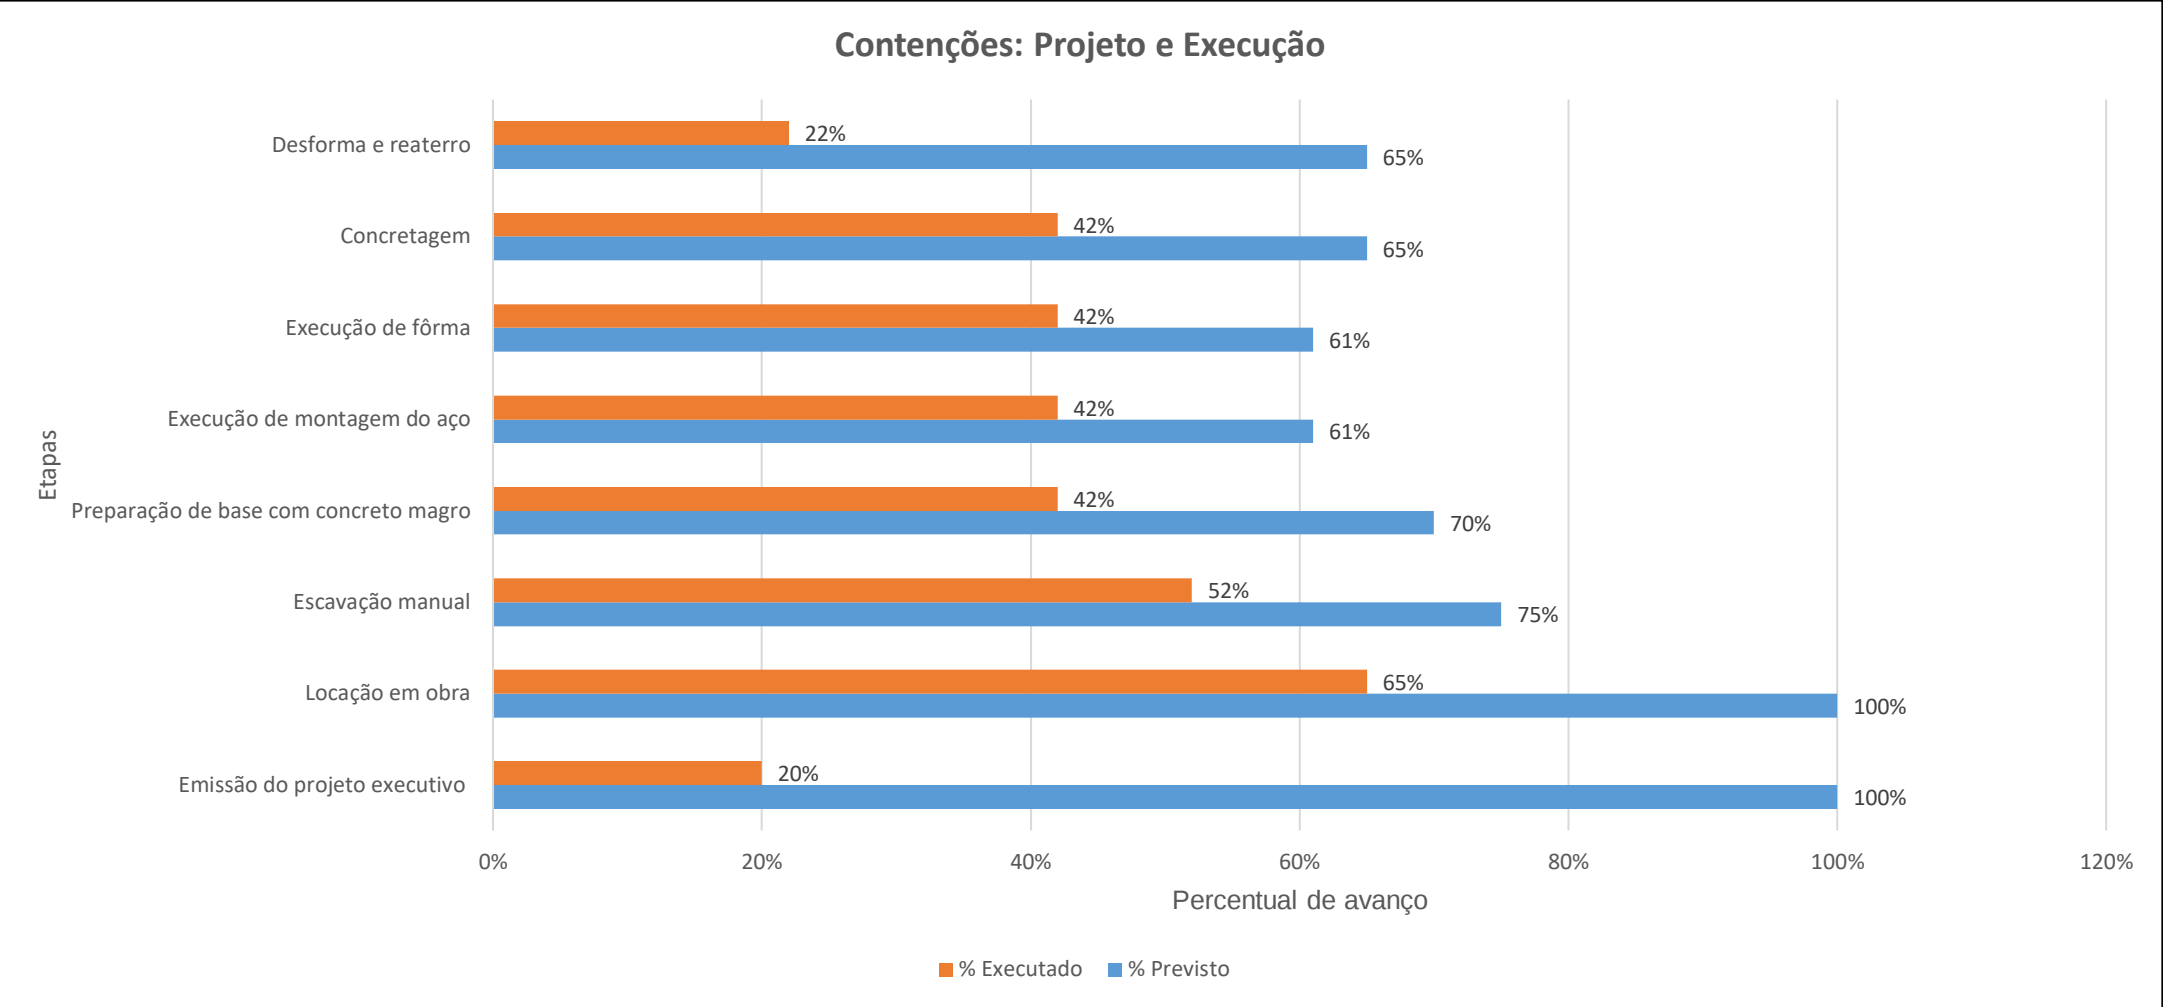

DIVERSOS

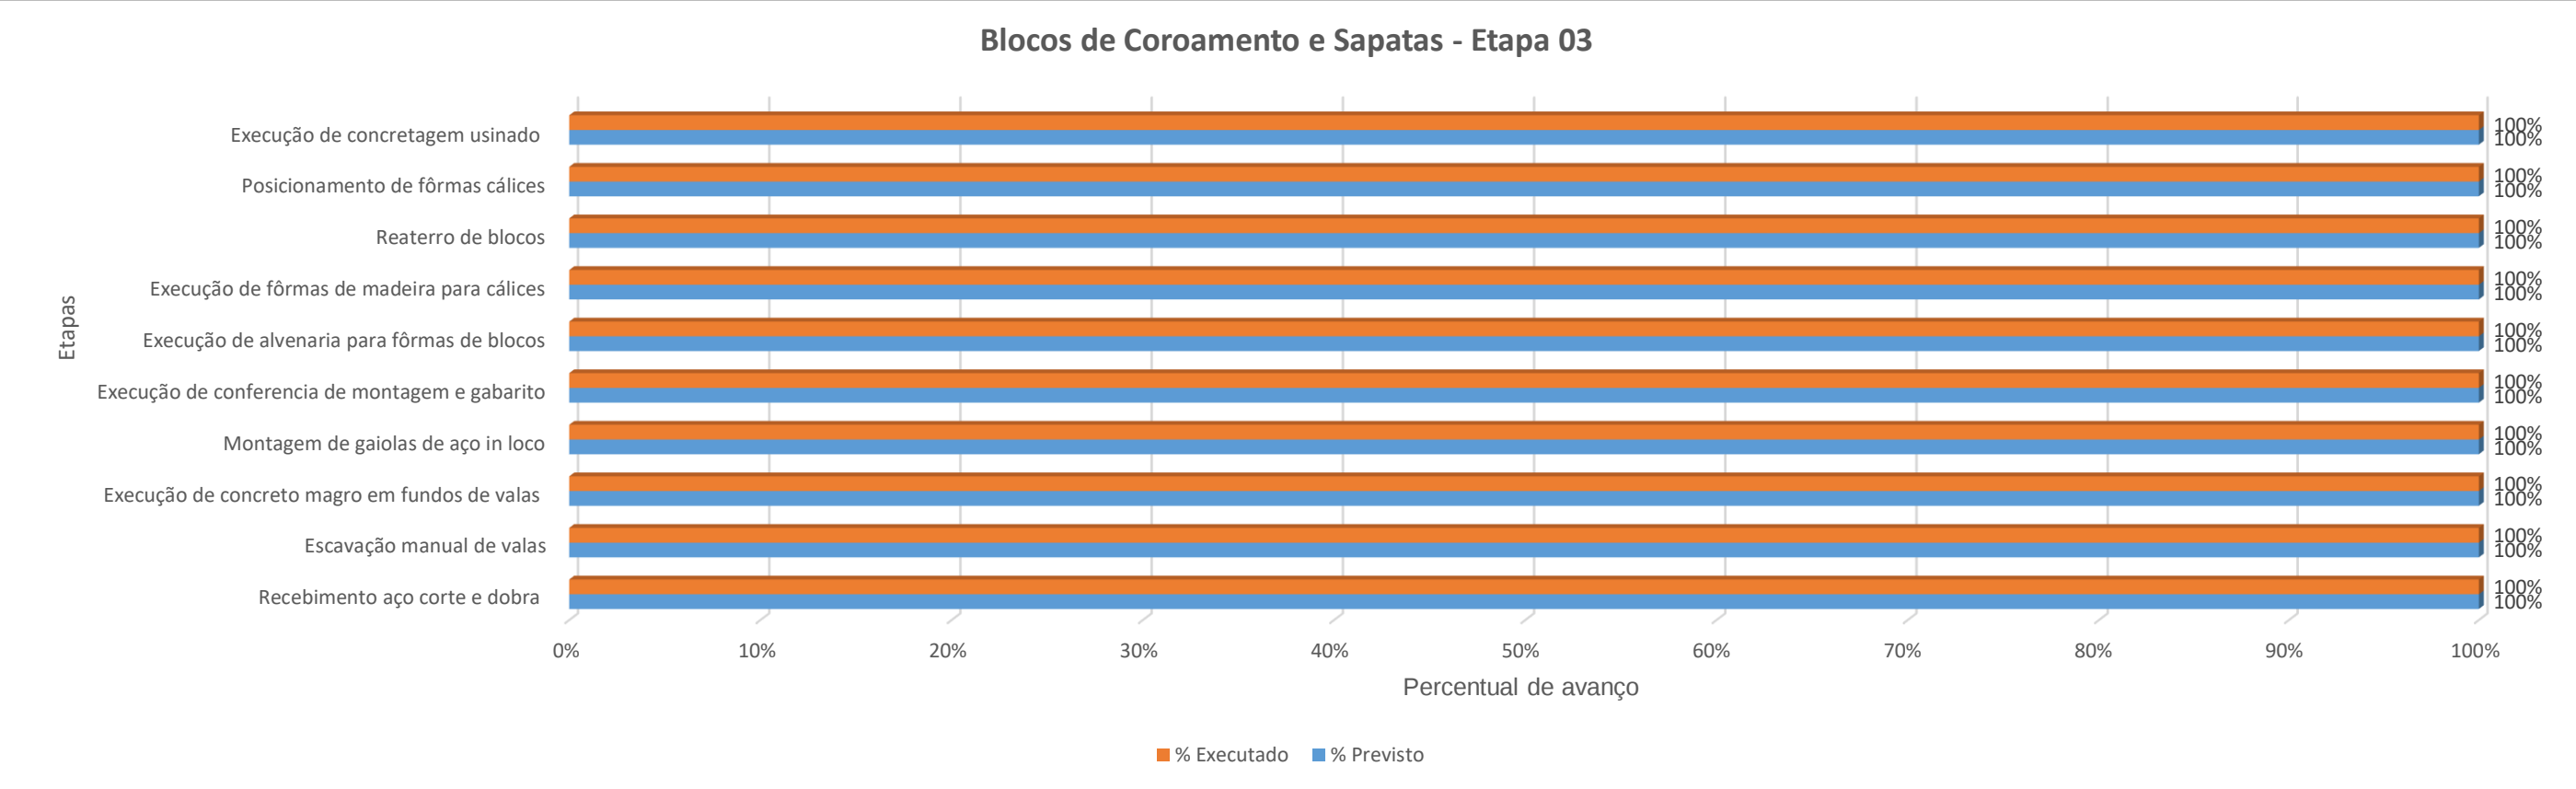

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
●	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- Em canteiro, foi finalização 100% da etapa de blocos de coroamento de fundação. A equipe segue a frente principal e critica de contenções, com escavações, execução de estacas escavadas de concreto, corte, dobra e montagem de armadura. Execução de parede dupla enrijecida, aplicação de impermeabilização e reaterro.	Equipe de engenharia alerta a adm da igreja com relação a necessidade de reposições na equipe. Também é alertado sobre a necessidade do recebimento dos projetos executivos das disciplinas de engenharia da igreja de jovens e estruturas auxiliares. Até a data do fechamento desse relatório segue pendente os recebimentos dos projetos executivos.
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Aguardamos os projetos executivos - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias. - Topógrafo realizou levantamento in loco de peças concretadas para aferição detalhadas do previsto versus executado. □	- Empresa de topografia realizou levantamento em campo, aguardando envio do levantamento em dwg. - Equipe de engenharia prepara base de consolidação para envio a ENPRO a aos projetistas, análise de cotas de fundo de cálice, eixos de cálices, etc.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO		CANTEIRO	
Status Geral	✔	Status Geral	⚠
PPRA	✔	EPI	✔
PCMSO	✔	EPC	✔
ASO	✔	TRABALHO EM ALTURA	⚠
FICHAS DE EPI	✔	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	✔
FICHAS DE REGISTRO	✔	EQUIPAMENTOS	✔

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
