

RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ


IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE
OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE
CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO




Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 04/08/2026
Quinzena Vigente 26Q16

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

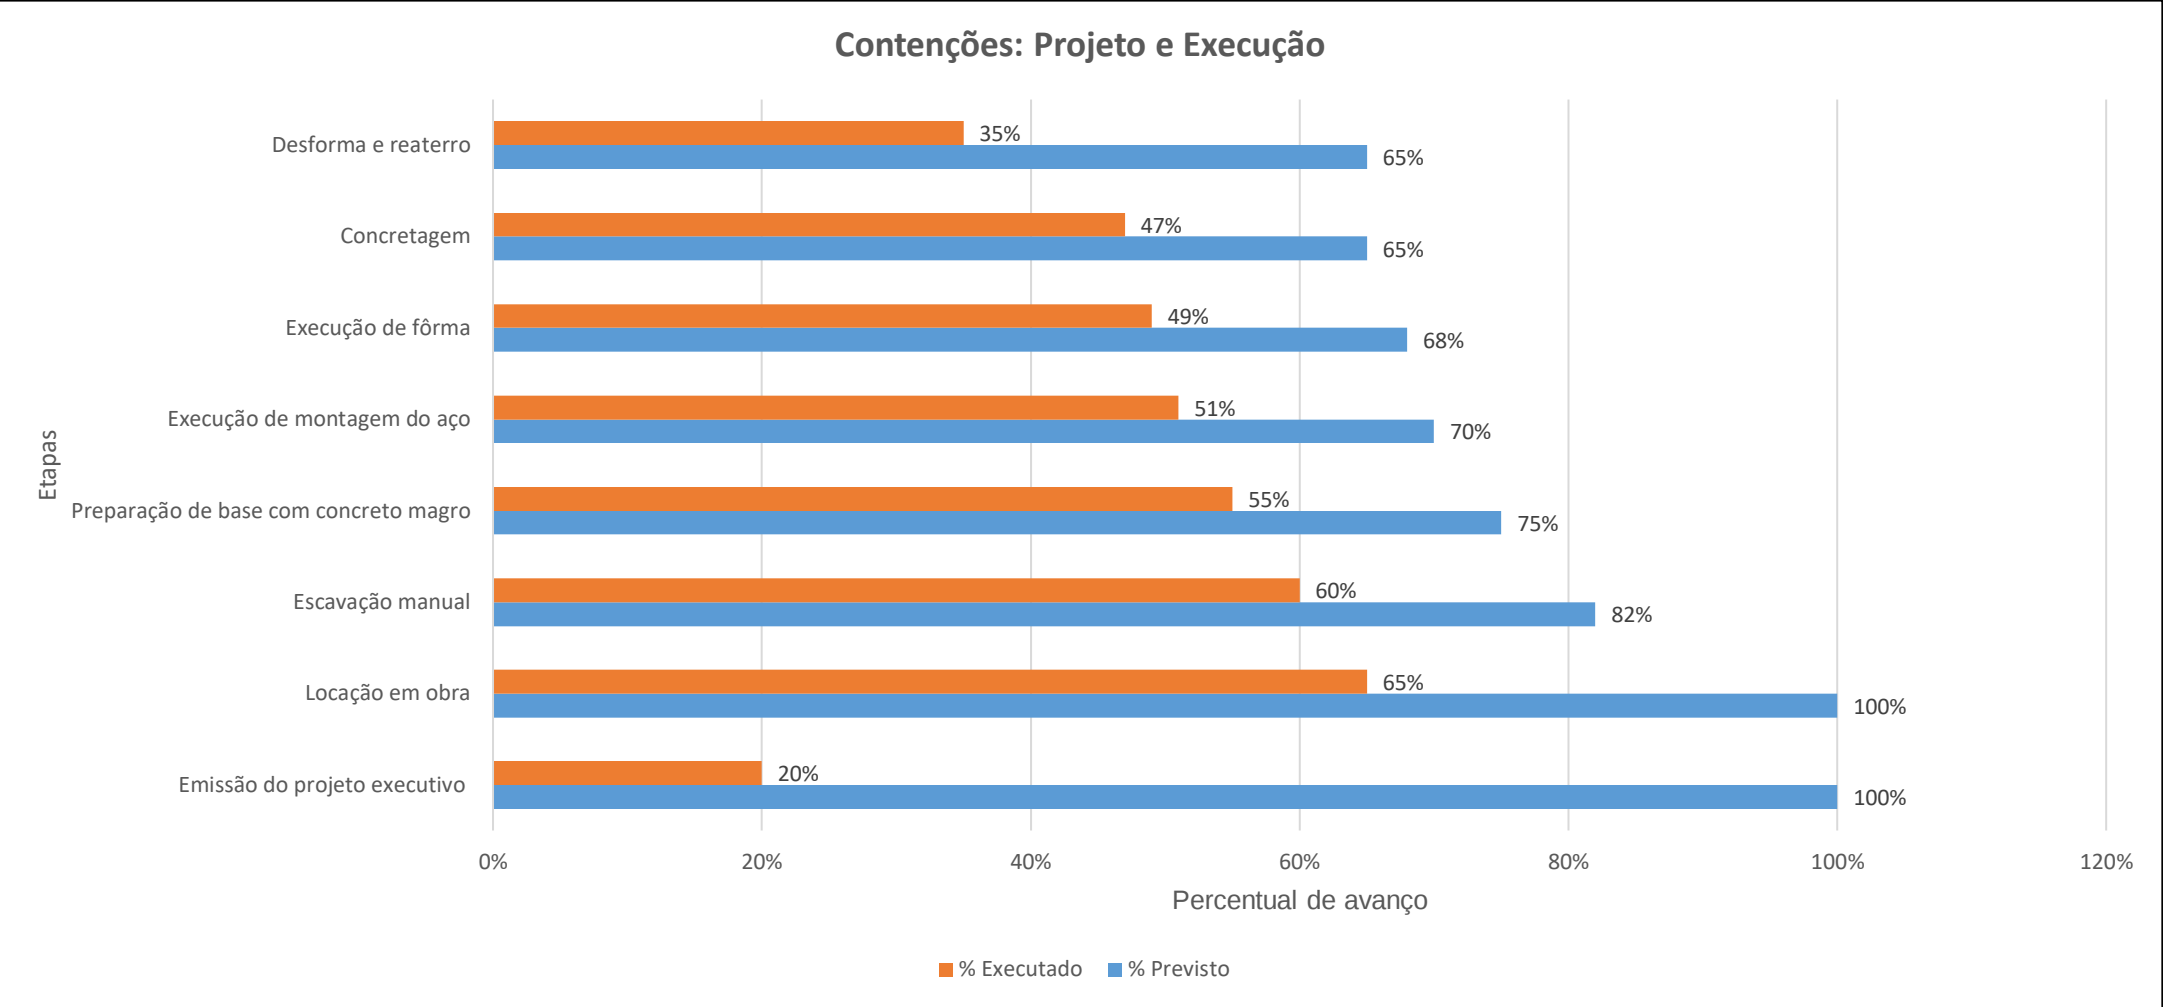

DIVERSOS

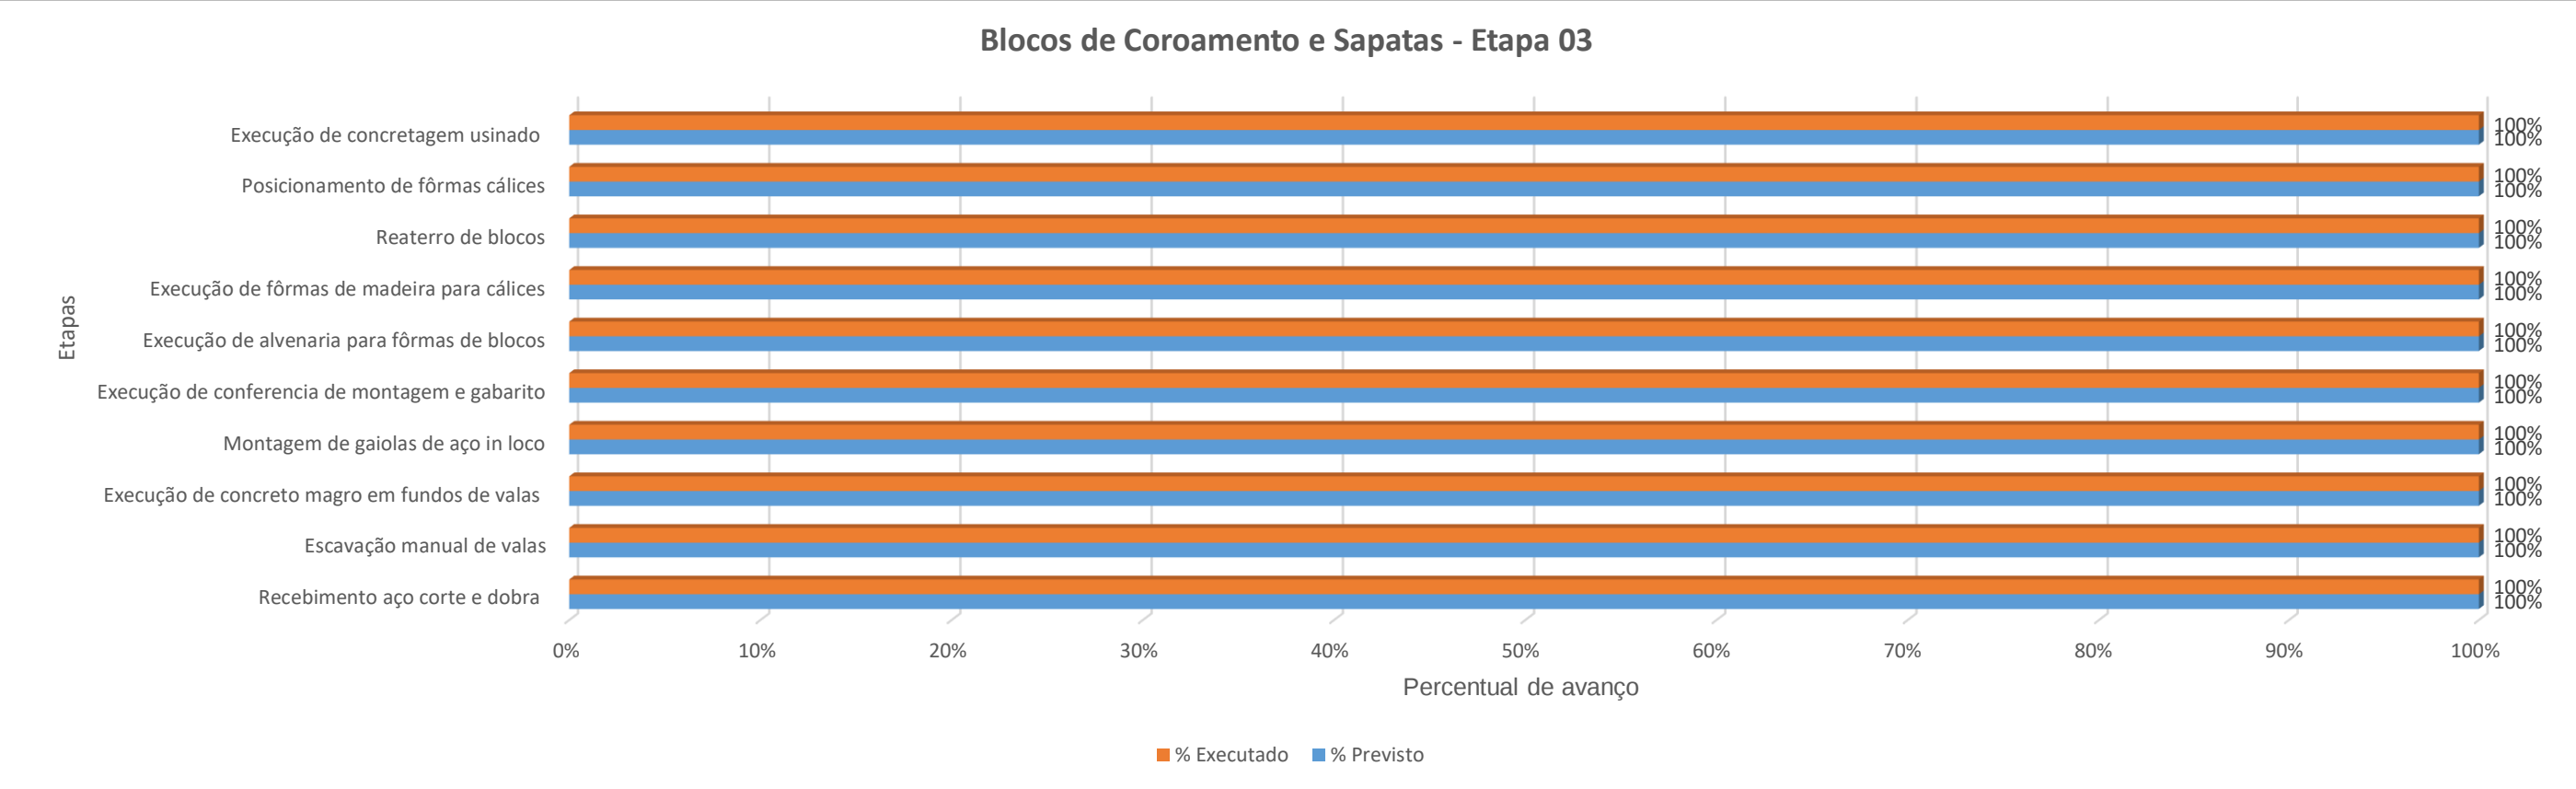

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
	Atividades	- É dado sequência a principal e ultima fase da etapa de fundações, a contenção! Essa etapa prevê a execução de escavação manual, execução de lastro de concreto magro, execução de estacas escavadas, execução esteira corrida, ou sapata corrida, que mede 2,5m de largura com 35cm de altura, é executado parede de concreto composta por blocos de cimento de 19cm de largura preenchido com concreto e fios de aço. O reaterro da etapa 1 já foi concluído, ou seja, essa parte da obra já está apta a receber a superestrutura.	Equipe de engenharia alerta a adm da igreja com relação a necessidade de reposições na equipe. Também é alertado sobre a necessidade do recebimento dos projetos executivos das disciplinas de engenharia da igreja de jovens e estruturas auxiliares. Até a data do fechamento desse relatório segue pendente os recebimentos dos projetos executivos.
	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Aguardamos os projetos executivos - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias. - Topógrafo realizou levantamento in loco de peças concretadas para aferição detalhadas do previsto versus executado. □	- Após o recebimento do levantamento pelo topografo, Equipe de engenharia prepara base de consolidação para envio a ENPRO, analise de cotas de fundo de cálice, eixos de cálices, etc

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO		CANTEIRO	
Status Geral		Status Geral	
PPRA		EPI	
PCMSO		EPC	
ASO		TRABALHO EM ALTURA	
FICHAS DE EPI		MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	
FICHAS DE REGISTRO		EQUIPAMENTOS	

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
