

RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ


IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE
OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE
CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO




Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 01/09/2026
Quinzena Vigente 26Q18

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

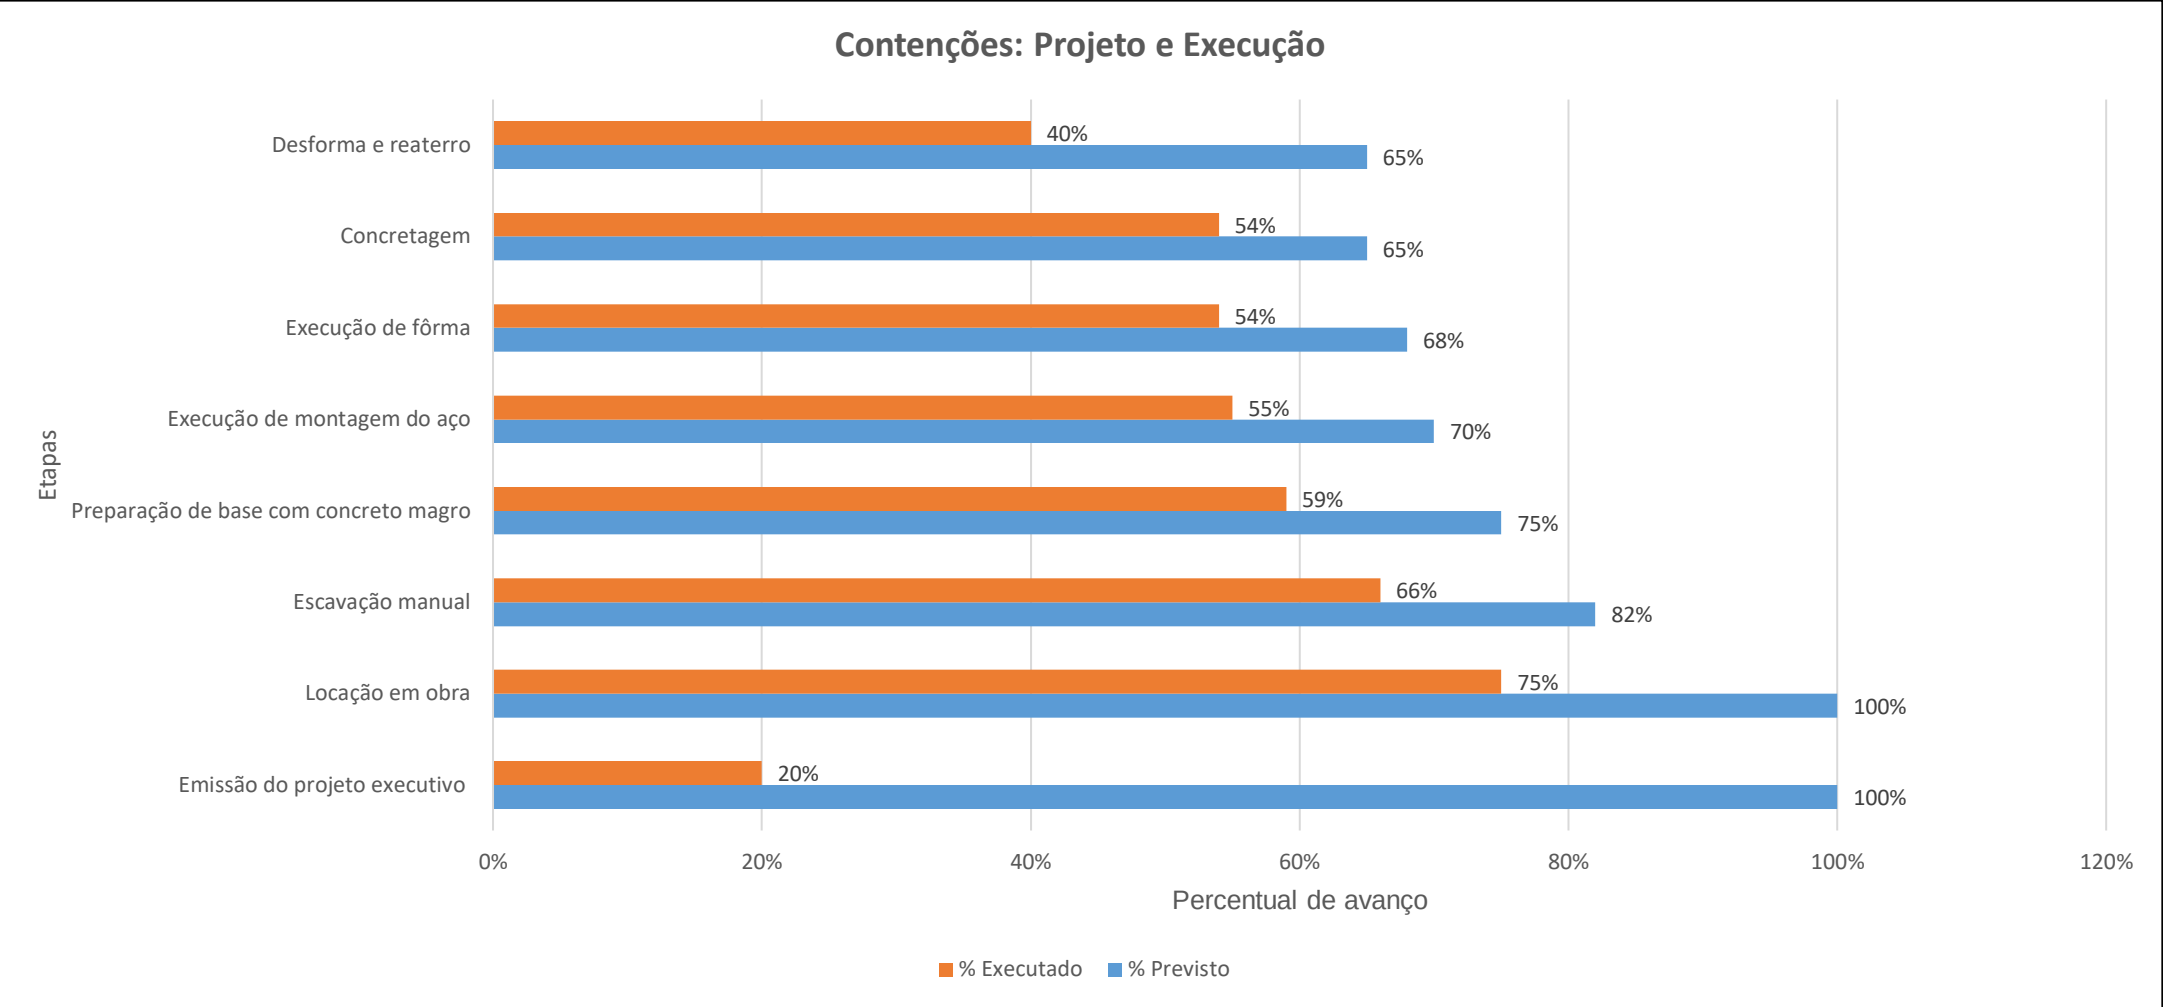

DIVERSOS

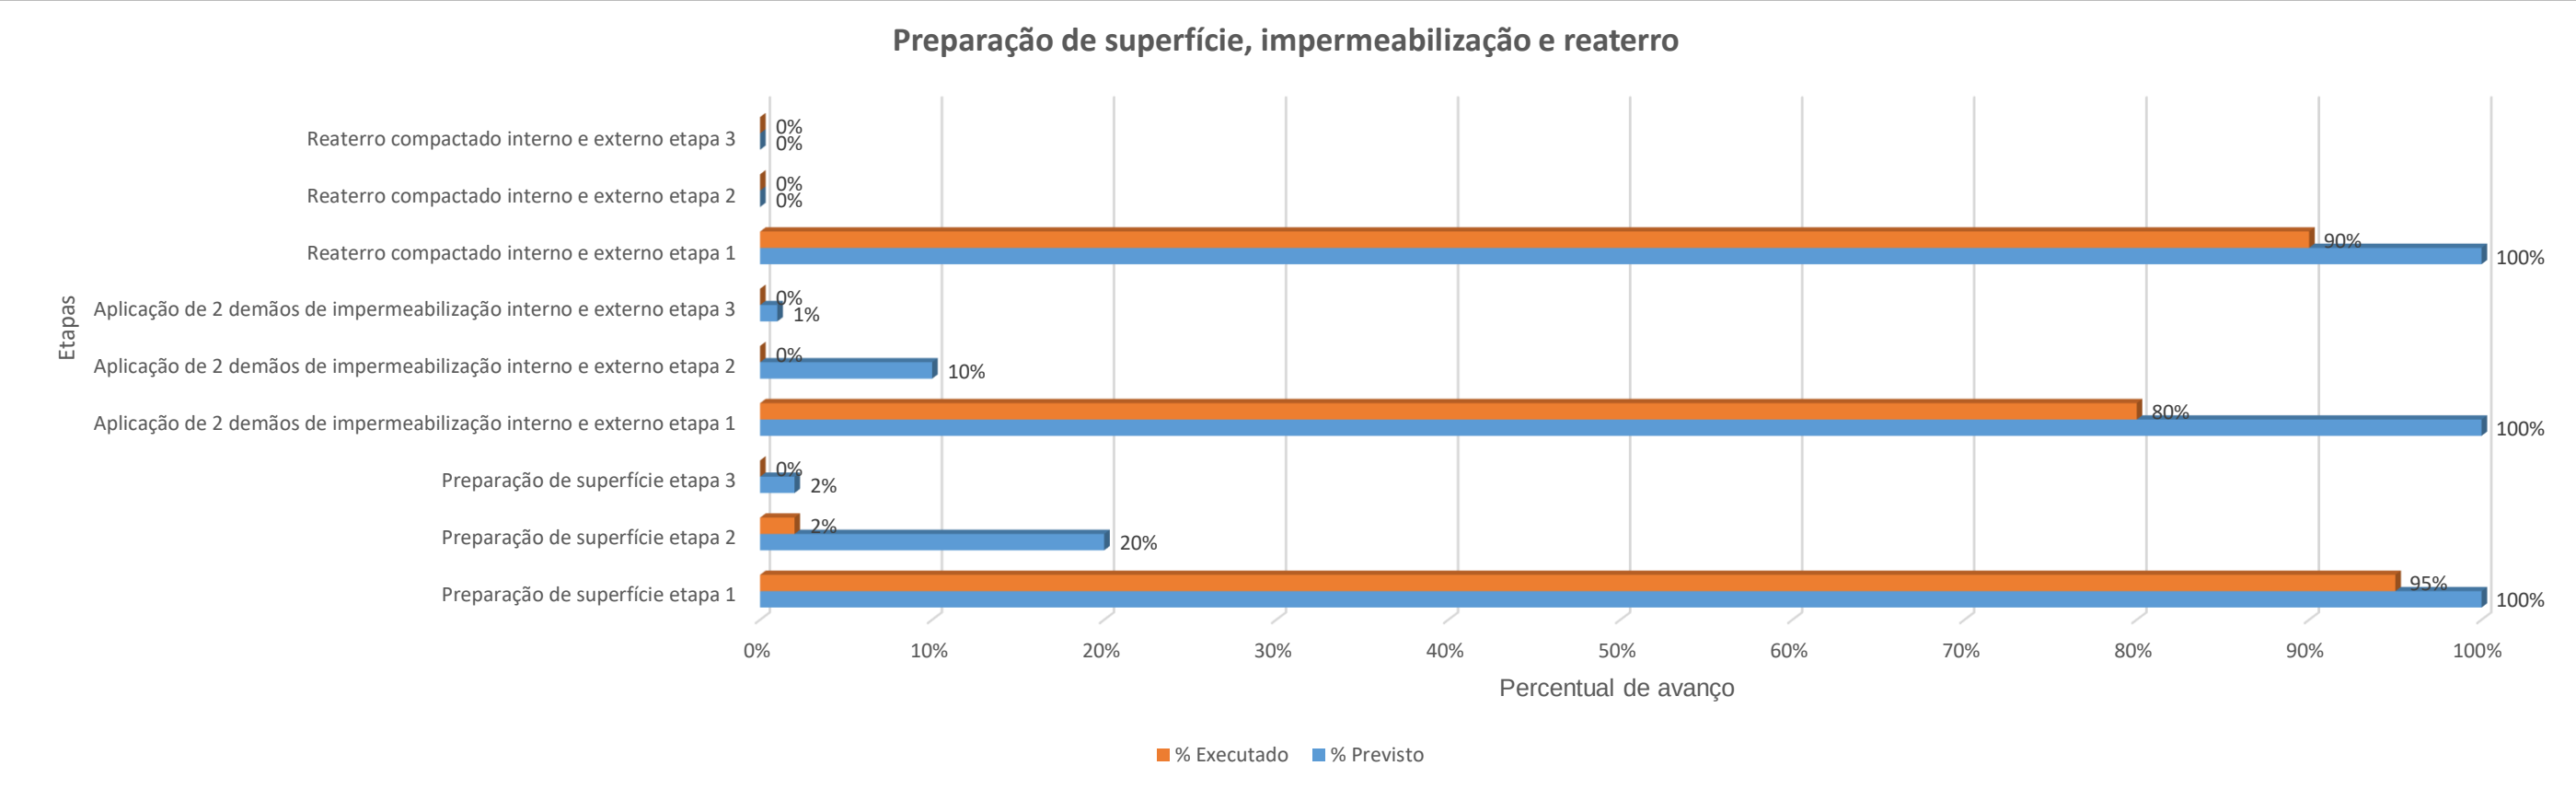

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
	Atividades	- Em canteiro é dado andamento a atividades relacionadas a equipa de contenção, que separa a fase 3 da etapa de fundação (estacas metálicas, blocos de coroamento e contenção). Escavação manual, execução de lastro de concreto magro, execução de corte, dobra e montagem de araduras de sapatas corridas, estacas escavadas, cintas e fios de aço em paredes. Posicionamento de fôrmas, concretagem com concreto moldado em obra de paredes de blocos de cimento, sapatas corridas e estacas escavadas..	Equipe de engenharia reitera junto a igreja a necessidade na celeridade no andamento do contrato junto a empresa de pré-fabricados para montagem da superestrutura, uma vez que a etapa de fundação já se encontra em +90% de avanço físico. É solicitado também o envio dos projetos executivos das disciplinas de engenharia do prédio de jovens. A equipe de engenharia solicita o envio de todos os projetos da CUT (central de utilidades). Pontos acima listados são alguns dos principais a serem considerados em caráter de urgência, uma vez que, o andamento e planejamento da obra pode ser impactado na ausência dessas ações
	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Aguardamos os projetos executivos - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias. - Topógrafo realizou levantamento in loco de peças concretadas para aferição detalhadas do previsto versus executado. □	- A equipe de engenharia recebeu e enviou para ENPRO o levantamento pós concretagem de uma 2º empresa de topografia, uma vez que, a 1º empresa que executou desde o início realizou algumas aferições/locações equivocadas, assim compromete a qualidade da obra. A equipe de engenharia recebeu o levantamento topográfico e realizou o envio a fabrica da ENPRO, para que possam realizar analises e considerações a respeito.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	
PPRA	
PCMSO	
ASO	
FICHAS DE EPI	
FICHAS DE REGISTRO	

CANTEIRO	
Status Geral	
EPI	
EPC	
TRABALHO EM ALTURA	
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	
EQUIPAMENTOS	

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
