

RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ


IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE
OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE
CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO




Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 15/09/2026
Quinzena Vigente 26Q19

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	#N/D
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	#N/D
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

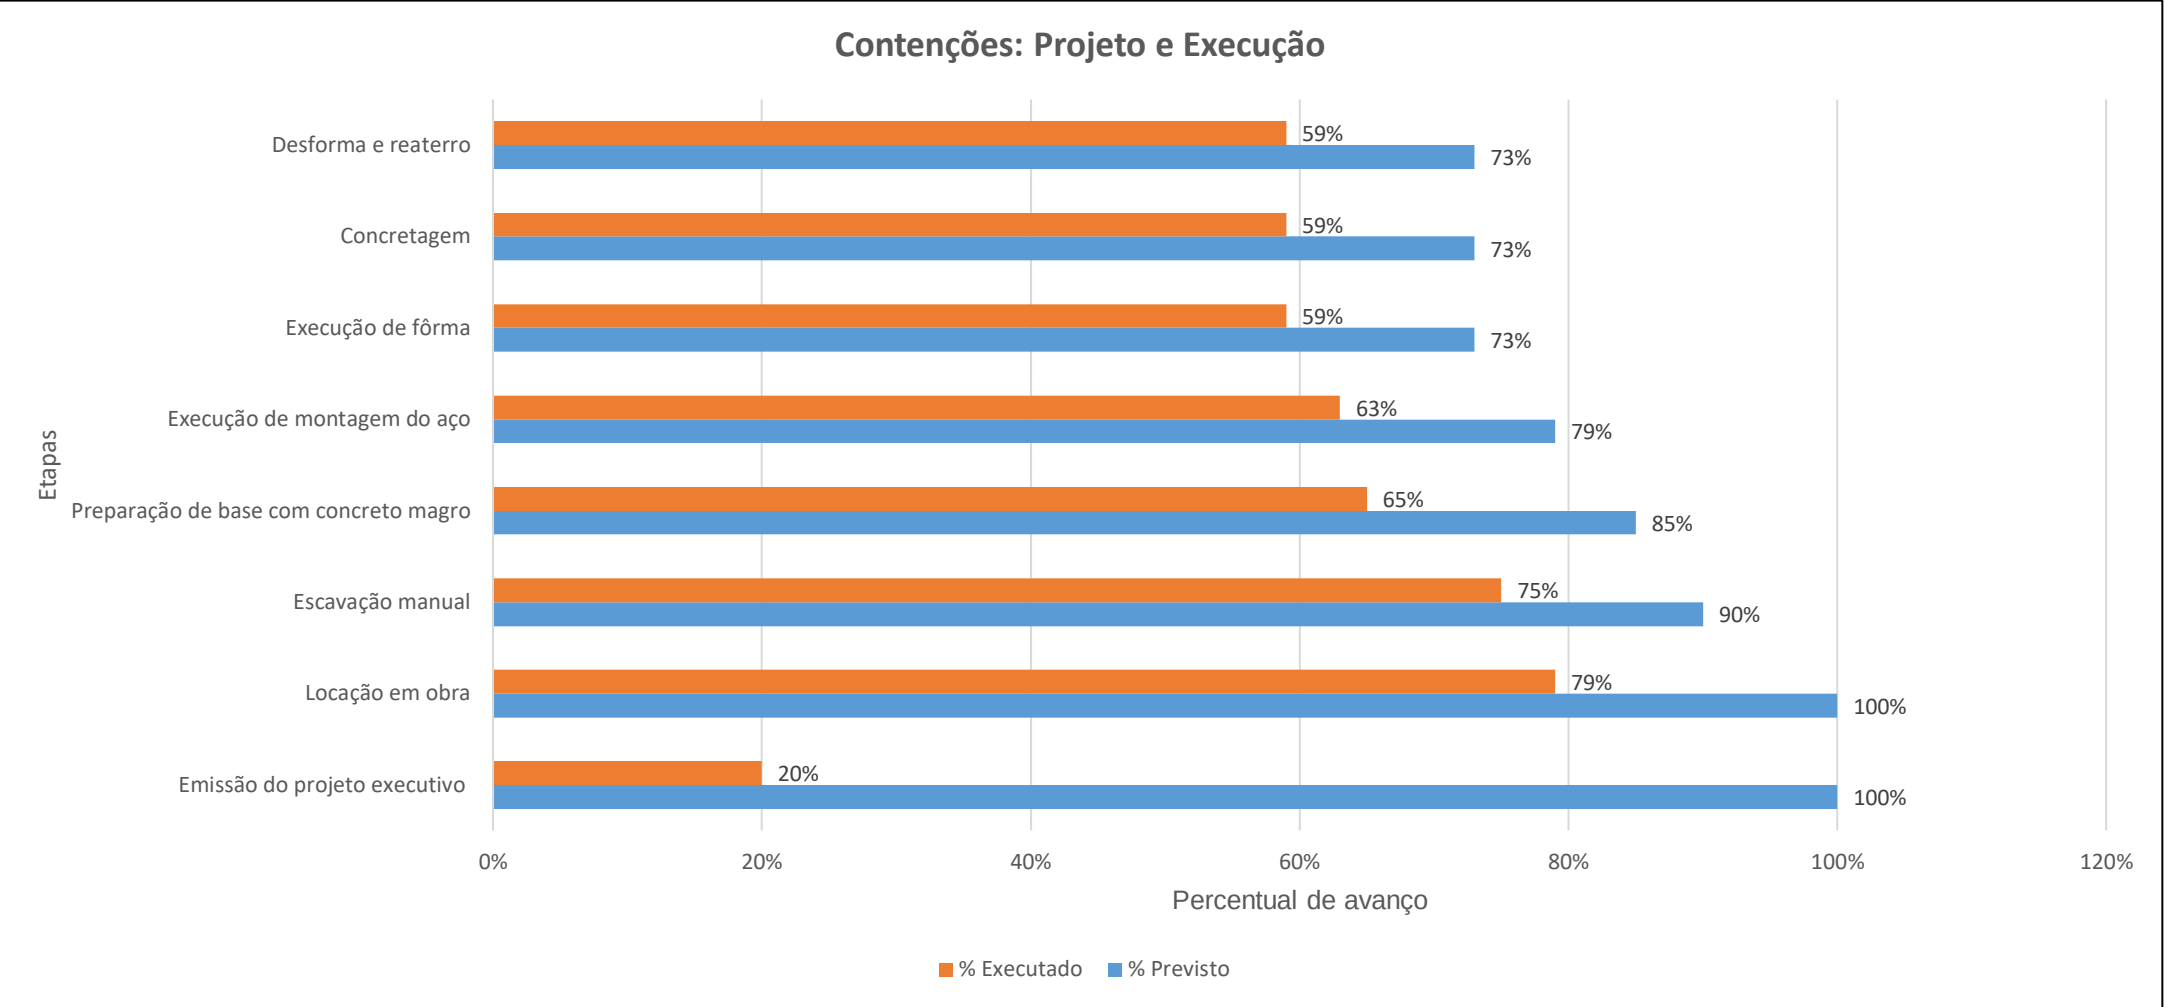

DIVERSOS

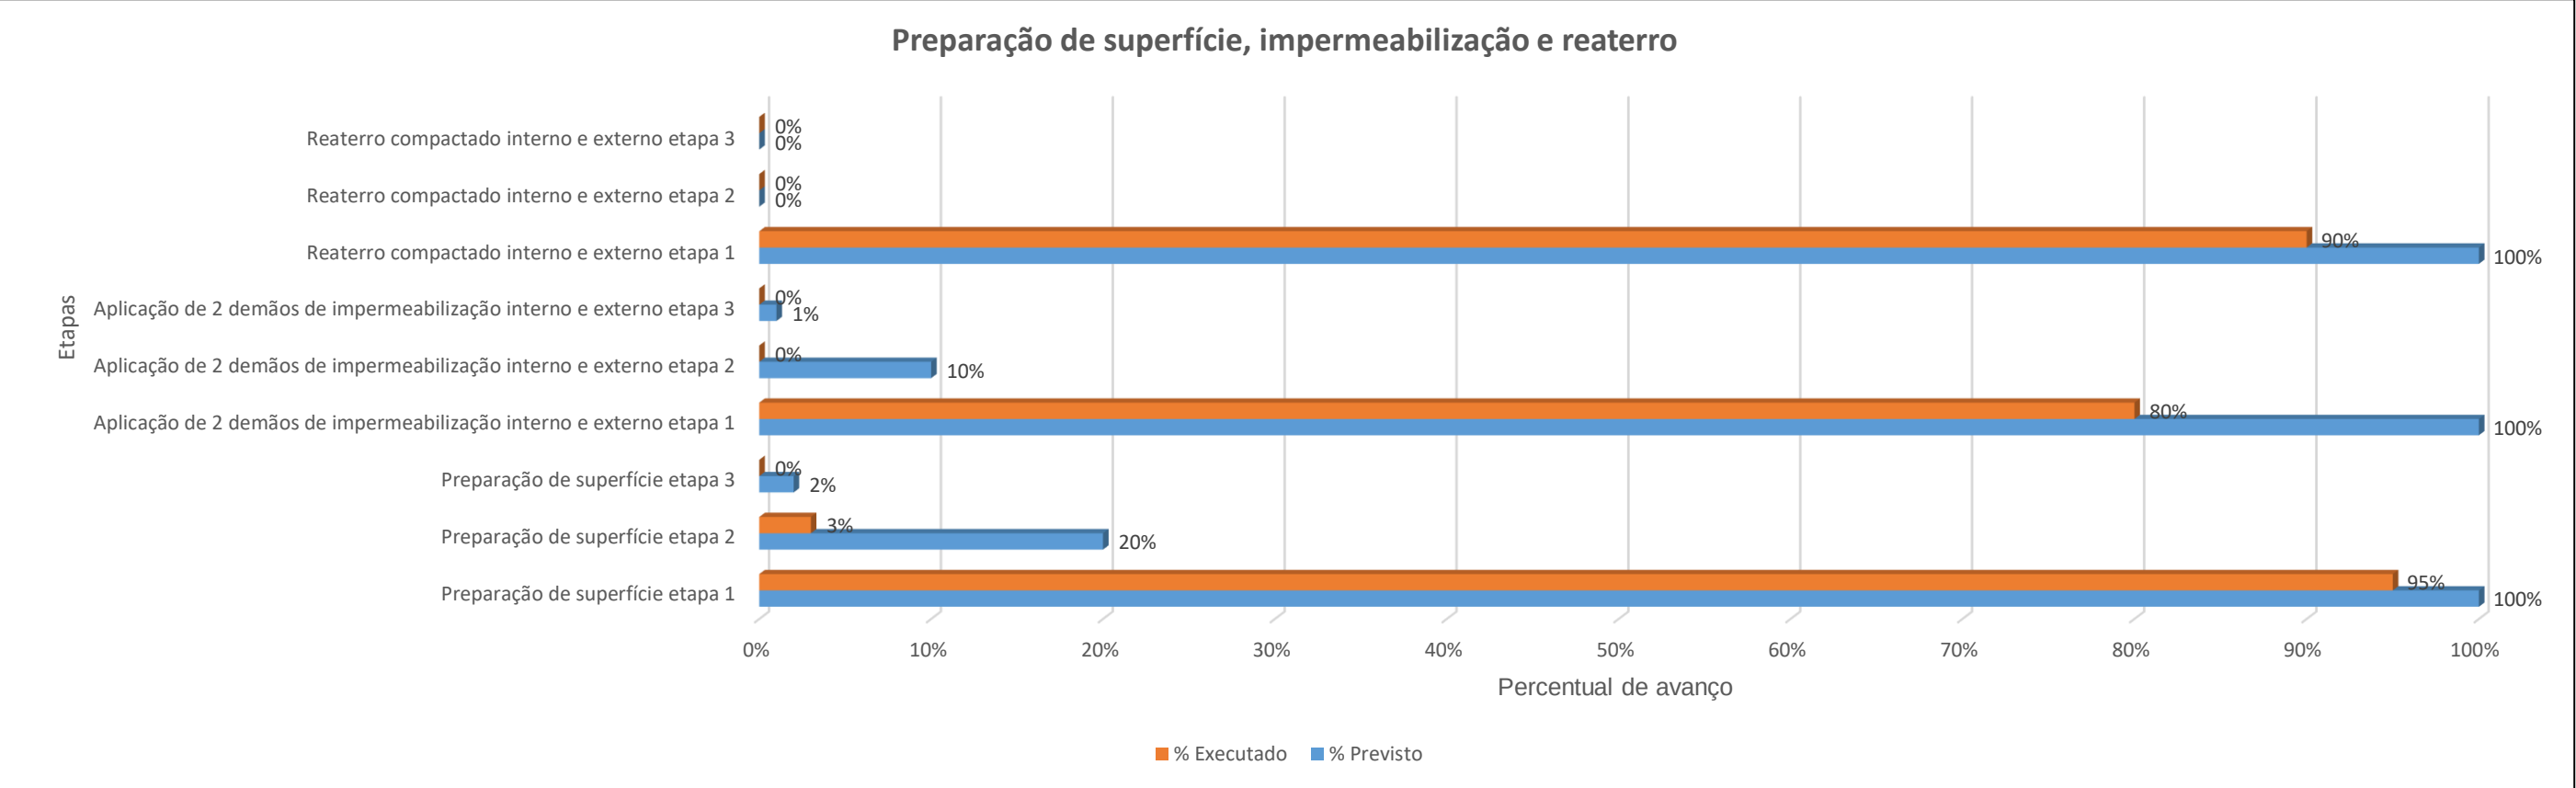

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
	Atividades	- As atividades no canteiro de obras seguem em ritmo controlado e dentro do planejamento. Atualmente, contamos com uma equipe de 10 pessoas, formada por 02 pedreiros, 03 ajudantes, 01 operador de betoneira, 01 carpinteiro, 01 mestre de obras e 01 almoxarife. Estamos nos aproximando da conclusão da etapa de fundação da contenção no entorno do prédio. Com o término dessa fase, a equipe dará início aos serviços da área interna da edificação. No momento, está em andamento a execução das paredes estruturais, com utilização de blocos de concreto, preenchimento com concreto e armaduras em aço. Também já foram executadas as estacas escavadas, o lastro de concreto magro e a remoção das fôrmas perdidas em alvenaria de blocos de coroamento, dando continuidade à execução da fundação e da contenção.	Equipe de engenharia reitera junto a igreja a necessidade na celeridade no andamento do contrato junto a empresa de pré-fabricados para montagem da superestrutura, uma vez que a etapa de fundação já se encontra em +90% de avanço físico. É solicitado também o envio dos projetos executivos das disciplinas de engenharia do prédio de jovens. Recebemos em 09/09 o projeto arquitetônico da Central de Utilidades. A equipe de engenharia, dará andamento ao estudo para emissão do projeto estrutural e elétrico.
	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Aguardamos os projetos executivos - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias. - Topógrafo realizou levantamento in loco de peças concretadas para aferição detalhadas do previsto versus executado. □	- A equipe de engenharia recebeu e enviou para ENPRO o levantamento pós concretagem de uma 2º empresa de topografia, uma vez que, a 1º empresa que executou desde o início realizou algumas aferições/locações equivocadas, assim compromete a qualidade da obra. A equipe de engenharia recebeu o levantamento topográfico e realizou o envio a fabrica da ENPRO, para que possam realizar análises e considerações a respeito.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	
PPRA	
PCMSO	
ASO	
FICHAS DE EPI	
FICHAS DE REGISTRO	

CANTEIRO	
Status Geral	
EPI	
EPC	
TRABALHO EM ALTURA	
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	
EQUIPAMENTOS	

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
