

RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ


IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE
OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE
CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO




Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 29/09/2026
Quinzena Vigente 26Q20

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	#N/D
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	#N/D
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

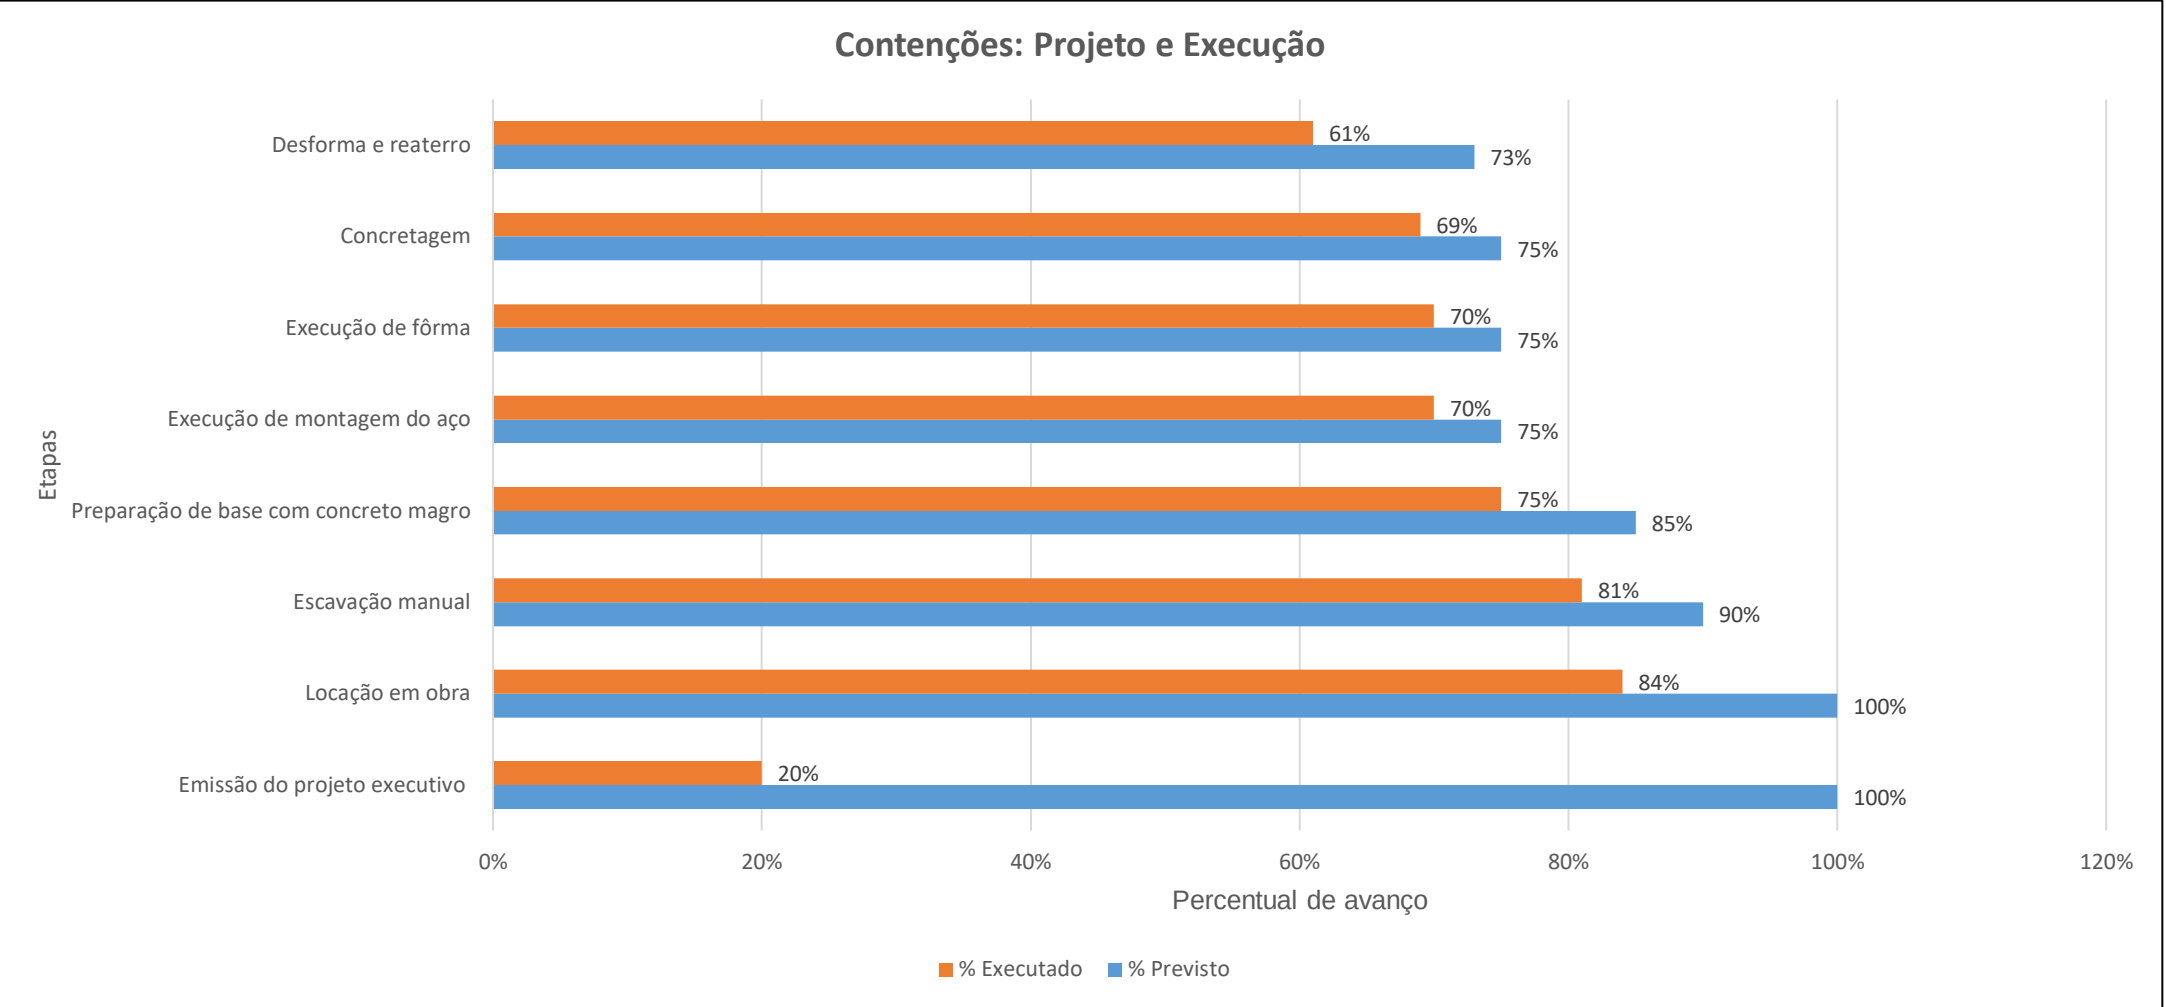

DIVERSOS

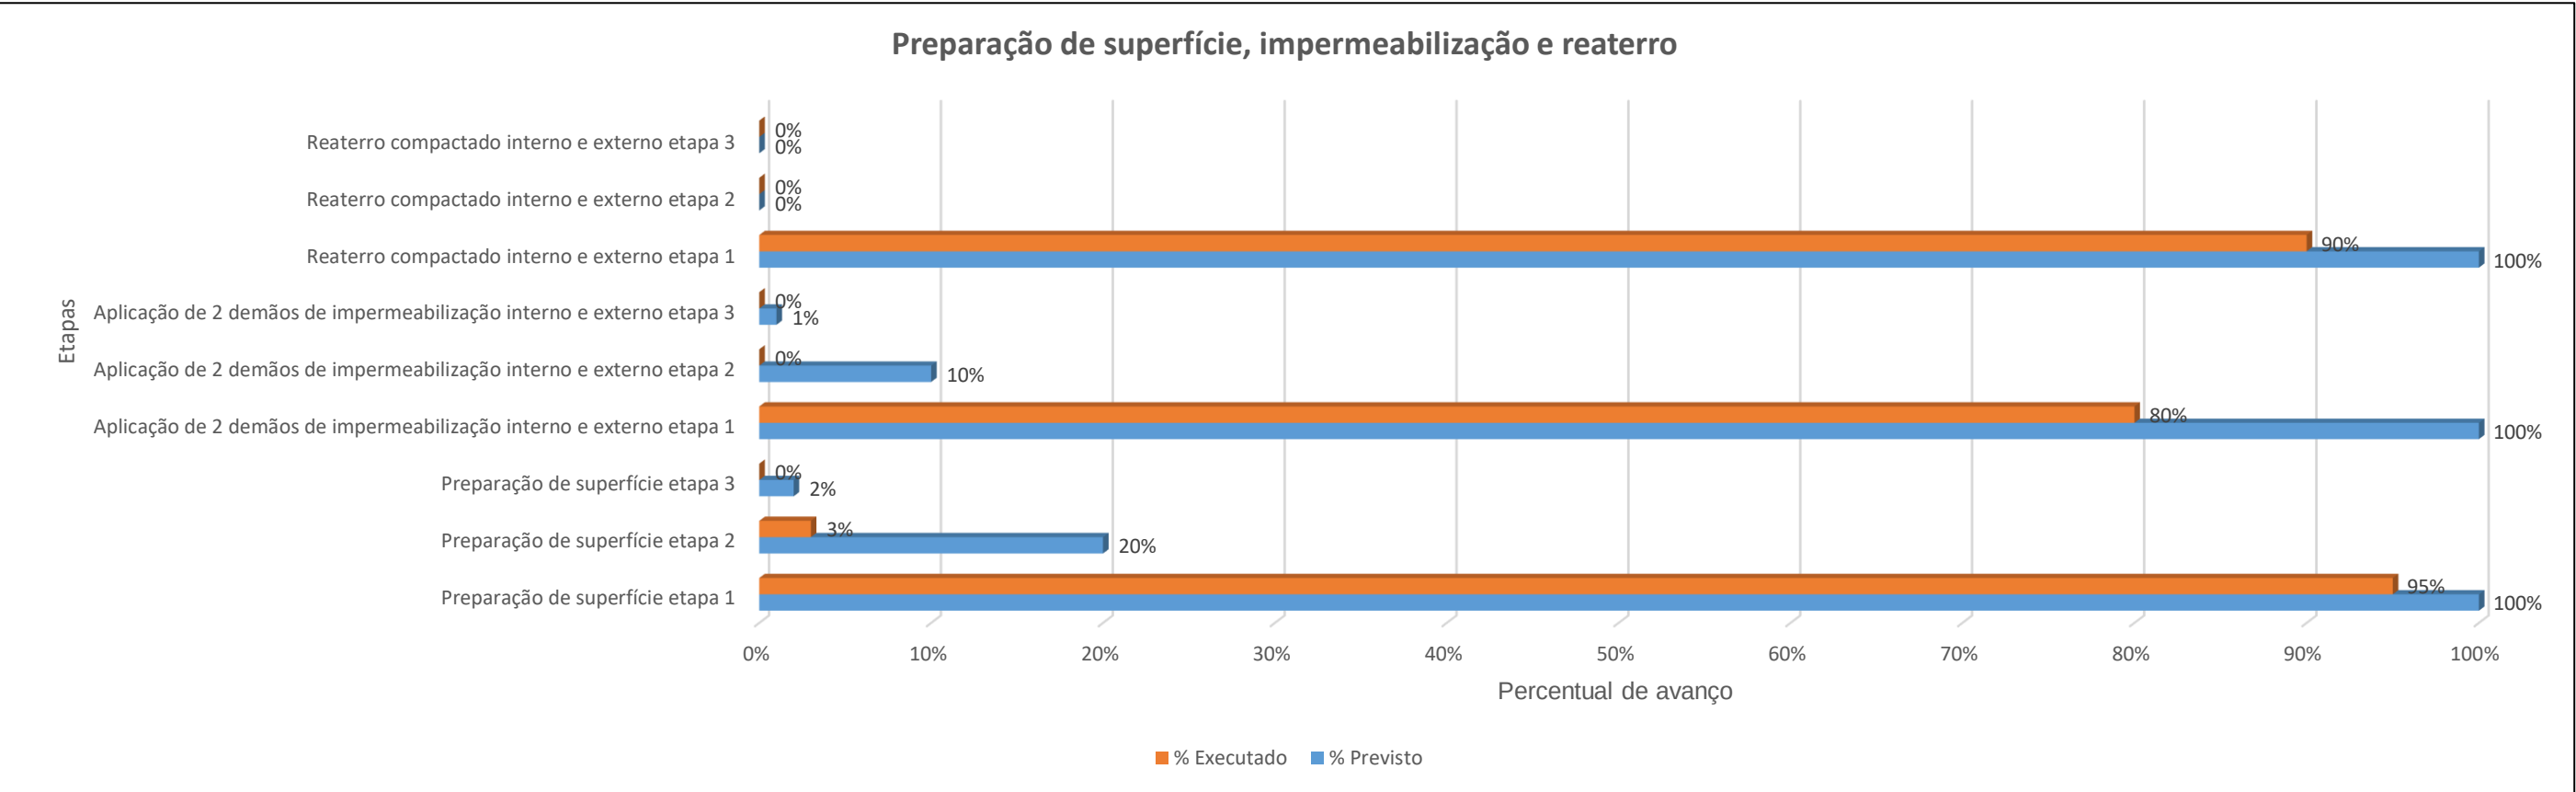

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
●	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- As frentes de serviço no canteiro de obras seguem voltadas a etapa de contenções, que é a 3ª fase da etapa de contenções. Atingimos 93% de avanço físico da fundação, e 67% da etapa de contenções. Escavação manual, execução de lastro de concreto magro, execução de estacas escavadas, corte, dobra e montagem de armaduras, fôrmas, concretagem de base, execução de parede estrutural com blocos de cimento, são algumas das atividades voltadas para essa fase. - Pretendemos em outubro finalizar toda periferia do prédio e atuar na parte interna, onde, também serão executadas algumas contenções, conforme projeto.	Recebemos no último período o projeto executivo arquitetônico do prédio. Os projetos de engenharia estão em elaboração, tendo como data máxima 21/10 para conclusão, conforme e-mail enviado pelo escritório contratado. A equipe de engenharia local, precisa receber os projetos para ter possibilidade de elaboração do orçamento macro da obra, demonstrando as próximas etapas.
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Aguardamos os projetos executivos - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias. - Topógrafo realizou levantamento in loco de peças concretadas para aferição detalhadas do previsto versus executado. □	- A equipe de engenharia recebeu e enviou para ENPRO o levantamento pós concretagem de uma 2ª empresa de topografia, uma vez que, a 1ª empresa que executou desde o início realizou algumas aferições/locações equivocadas, assim compromete a qualidade da obra. A equipe de engenharia recebeu o levantamento topográfico e realizou o envio a fábrica da ENPRO, para que possam realizar análises e considerações a respeito.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	✓
PPRA	✓
PCMSO	✓
ASO	✓
FICHAS DE EPI	✓
FICHAS DE REGISTRO	✓

CANTEIRO	
Status Geral	⚠
EPI	✓
EPC	✓
TRABALHO EM ALTURA	⚠
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	✓
EQUIPAMENTOS	✓

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
