RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 08/07/2025
Quinzena Vigente 25Q13

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	14/12/2025
Término c/ aditivos:	
Término tendência	14/12/2025
Duração (dias)	230
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

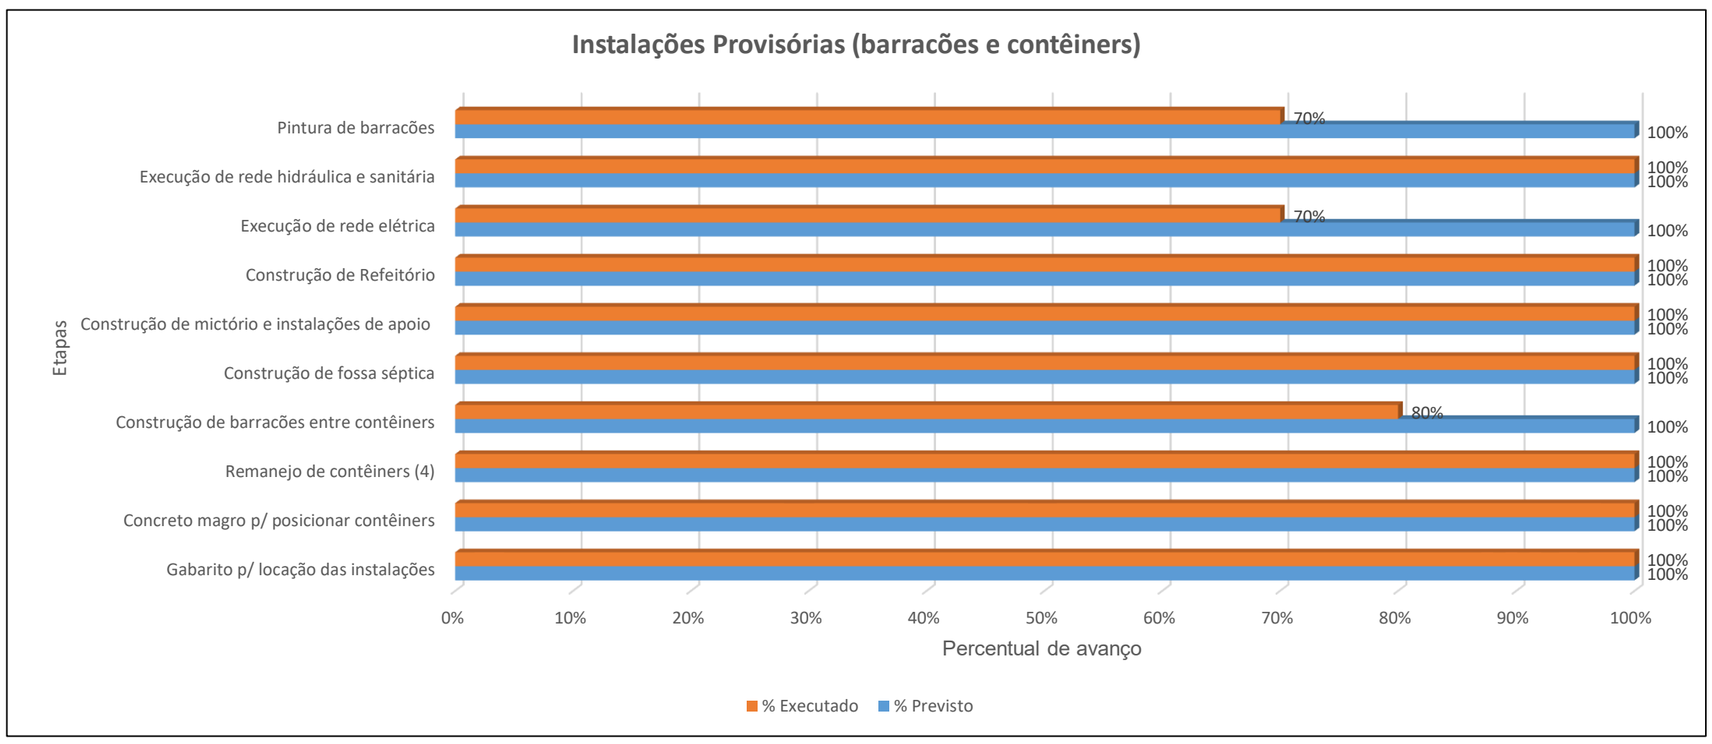

DIVERSOS

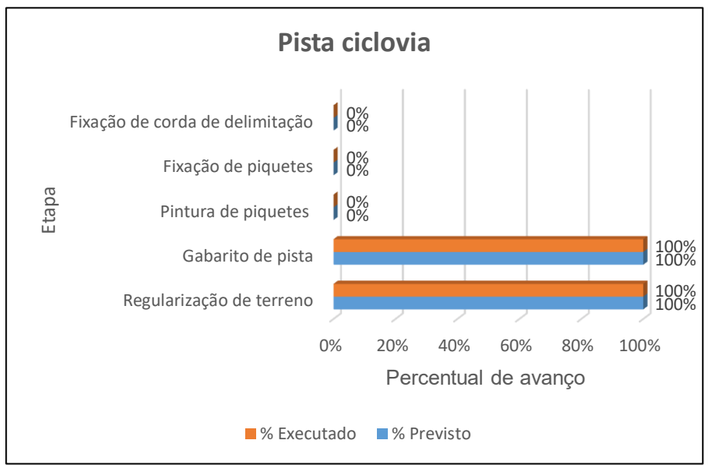

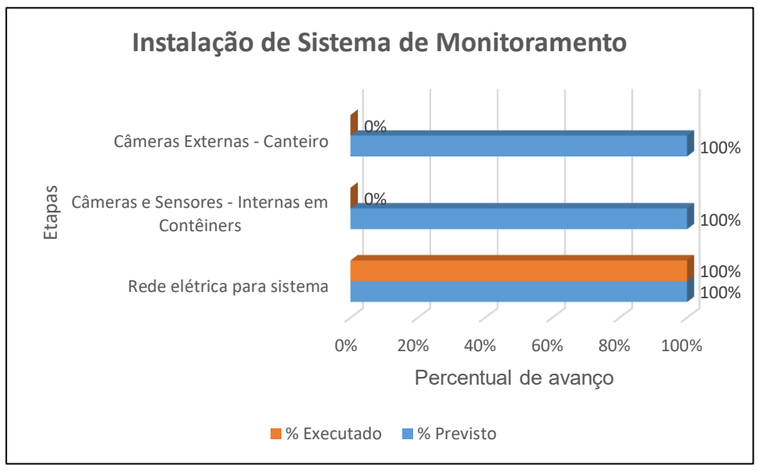

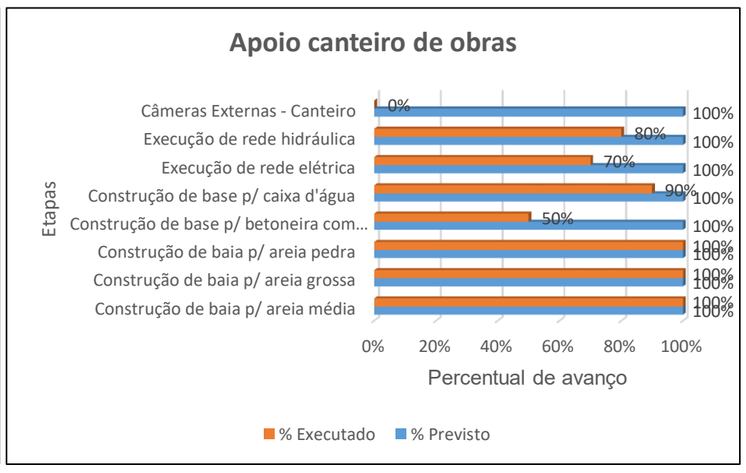

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
▲	Licenças	- Alvará: Em processo de análise por parte de prefeitura, precisão de conclusão para 30/06/25. - Corpo de bombeiros: Aguardando projeto de combate à incêndio para abertura de protocolo de analise junto ao órgão competente. - Licença ambiental: Aguardando emissão de licença de obra para abertura de protocolo. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia para saber a demanda e abrir protocolo junto à concessionária em questão. - Energia: Aguardando memorial técnico com informações de consumo para abertura de protocolo junto à concessionária.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- Em canteiro, foi concluído a construção já com coberta dos 3 barracões (armação, alvenaria e refeitório) o refeitório já está concluído por completo, inclusive com energia. Os outros dois barracões resta o contrapiso, bancadas e ligação de energia. A caixa d'água já está instalada, inclusive o canteiro de obra já está sendo abastecido por ela. A instalação elétrica no container do escritório já foi realizada. A construção doa brigo da betoneira, já com contrapiso foi realizada. Foi entregue o material para execução das estacas, 27ton de trilhos de trem. A placa legal da obra foi produzida a instalada. 75% das instalações foram pintadas com compressor.	À lista preliminar de materiais e serviços para esta etapa já está disponível.
●	Fornecedores	- Executora de fundação profunda com estacas metálicas: Previsão de mobilização do bate-estacas para até 11/07/25, recebimento do projeto de estaqueamento, previsão do recebimento do projeto de blocos sobre estacas para até 11/07/25. - Material para cravação de estacas - Trilho TR37: 744 recebidos em obra. - Material para cravação de estacas - Tubos de aço: 288 metros de tubos de 3 1/2 polegadas com 6 mm de espessura, compra realizada em 09/06/25 com pagamento à vista. O transporte do material ocorrerá juntamente com o bate-estacas. - Contrato assinado com empresa de pré-fabricados, previsão de transporte de peças estruturais para o canteiro de obras para 09/2025.	À equipe adm local segue monitorando os processos
