RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 05/08/2025
Quinzena Vigente 25Q15

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	14/12/2025
Término c/ aditivos:	
Término tendência	14/12/2025
Duração (dias)	230
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	✓
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

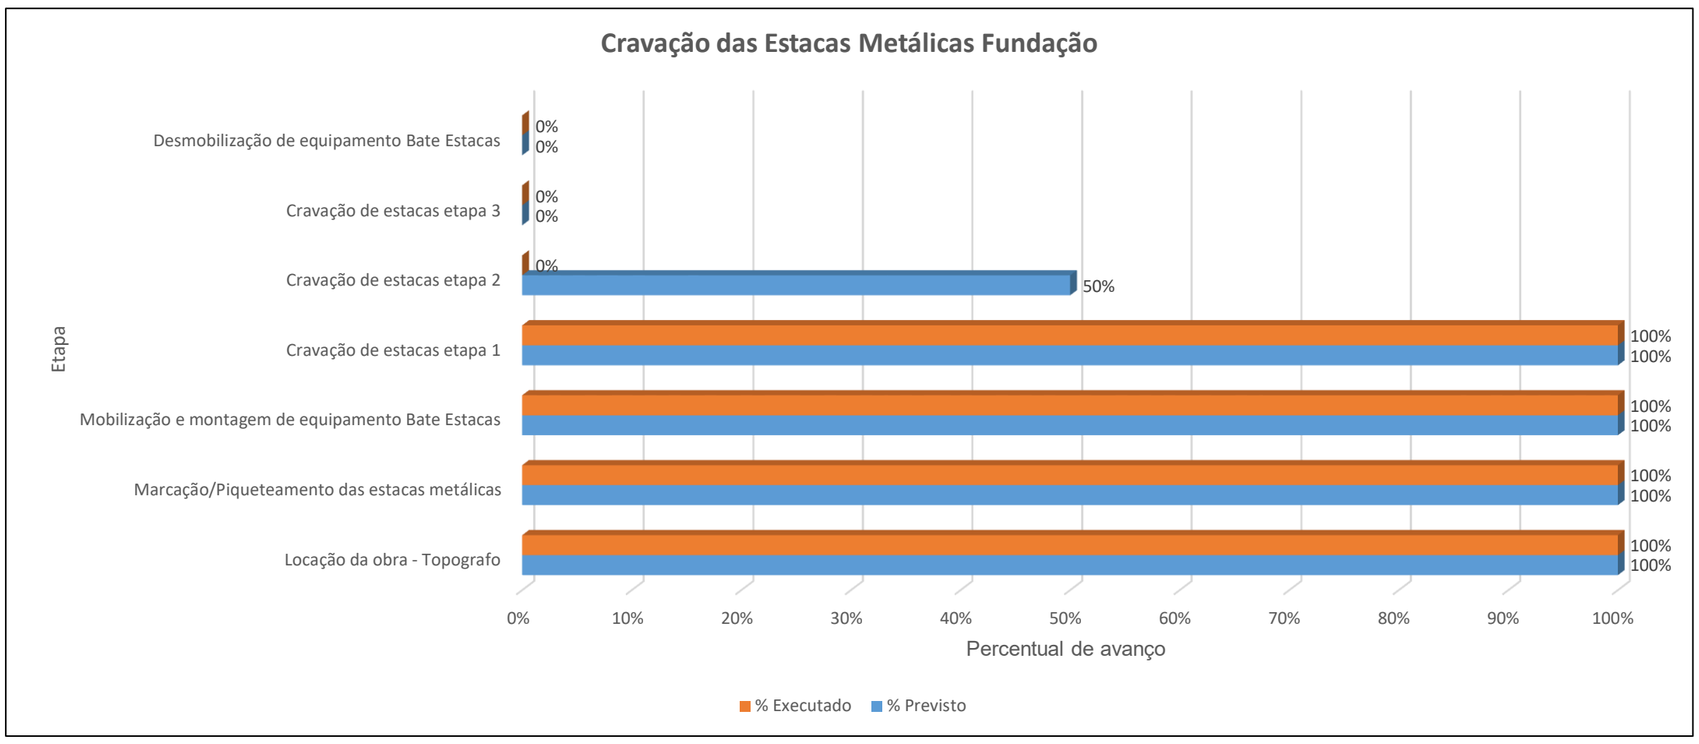

DIVERSOS

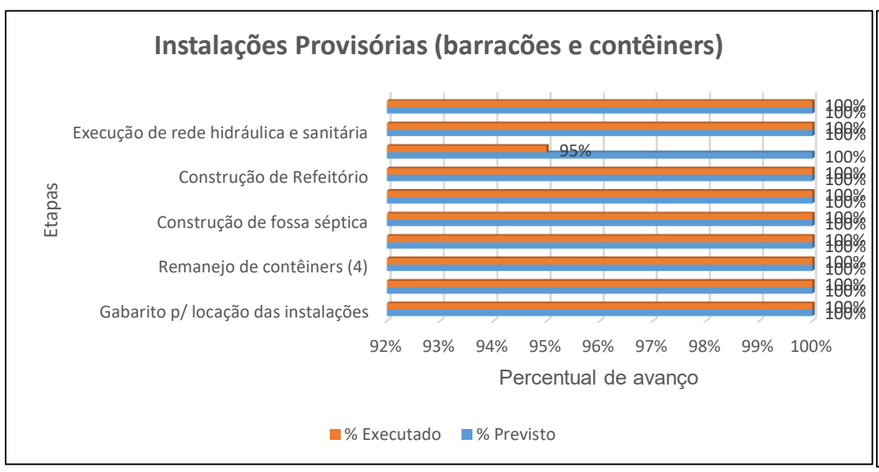

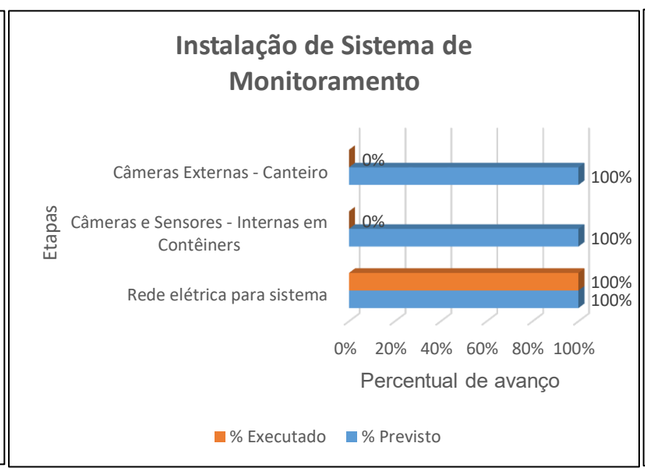

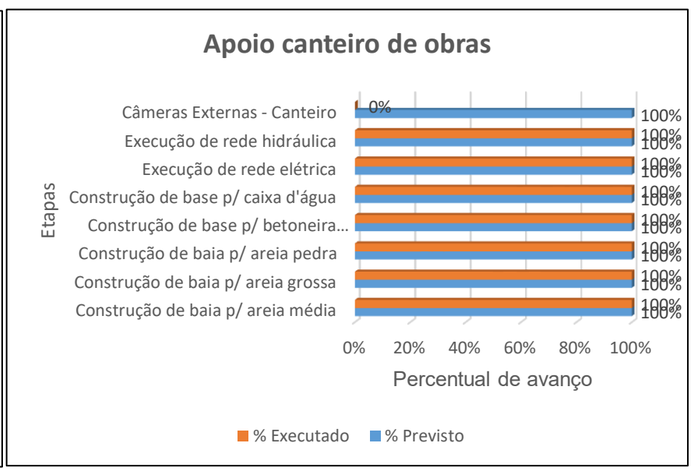

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
△	Licenças	- Alvará: Em processo de análise por parte de prefeitura, precisão de conclusão para 30/06/25. Não ocorreu! Emitida anuência em 09/07/25. Aguardando nova previsão. - Corpo de bombeiros: Em 09/07/25 foi emitido anuência por parte da prefeitura para submeter a aprovação junto ao órgão do corpo de bombeiro. - Licença ambiental: Em 09/07/25 foi emitido anuência por parte da prefeitura para submeter a aprovação junto ao órgão competente. Em 31/08/25 recebemos a licença ambiental de implantação. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia para saber a demanda e abrir protocolo junto à concessionária em questão. - Energia: Aguardando memorial técnico com informações de consumo para abertura de protocolo junto à concessionária. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Em 09/07/25 foi emitido anuência por parte da prefeitura para submeter a aprovação junto ao órgão competente.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- Em canteiro, foram concluídas instalações elétricas de 02 containers, restando apenas 01 container + abrigo de betoneira. Foi realizado execução de abrigo anexo para estacionamento de bicicletas e motos de operários. Iniciado a cravação de estacas metálicas pela equipe da DVL fundações em 26/07/25, em 02/08/25 foi concluída a cravação da etapa 1 de 3, ou seja, cravadas 57 estacas de 19 blocos. Iniciado em 04/08/25 cravação das estacas da etapa 2 de 3. O gabarito da obra está sendo implantado. Recebemos da arquitetura pranchas com revisões de níveis, o estudo para implantação in loco já está em curso.	À lista preliminar de materiais e serviços para esta etapa já está disponível.
●	Fornecedores	- Executora de fundação profunda com estacas metálicas: Mobilizada carreta em 24/07/25, iniciado a cravação em 26/07/25. - Contrato assinado com empresa de pré-fabricados, previsão de transporte de peças estruturais para o canteiro de obras para 09/2025. - Contratado serviço de serralheira para execução de estrutura de fechamento lateral da caixa d'agua de forma instagramável. - Identificado pela equipe de engenharia ausência de projeto de contenções. Empresa parceira já se dispôs a executar em oferta ao capítulo 2.	À equipe adm local segue monitorando os processos
