RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 16/09/2025
Quinzena Vigente 25Q18

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	14/12/2025
Término c/ aditivos:	
Término tendência	14/12/2025
Duração (dias)	230

Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	✓

Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

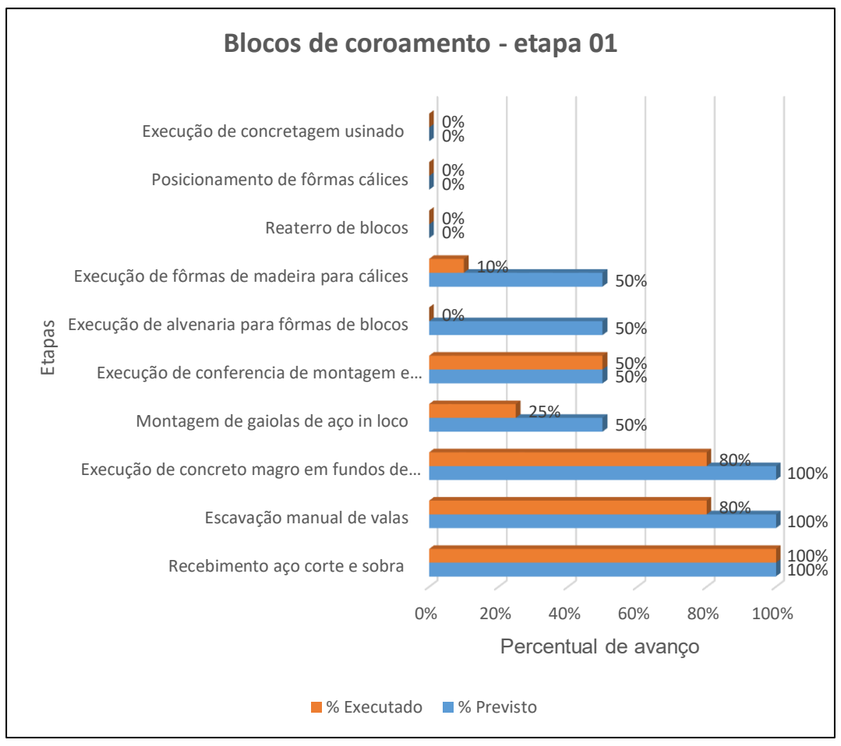

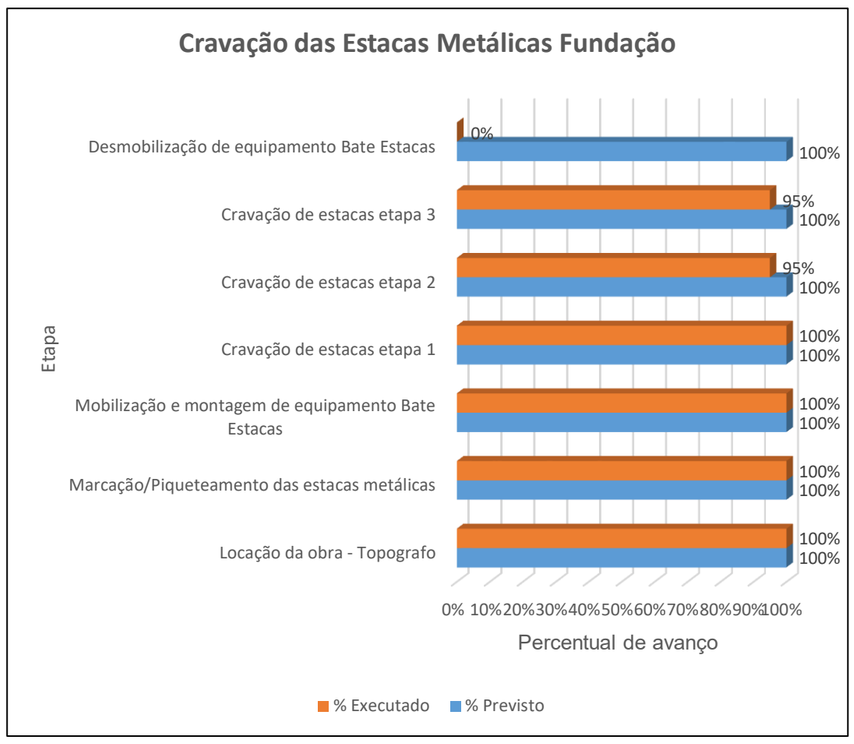

DIVERSOS

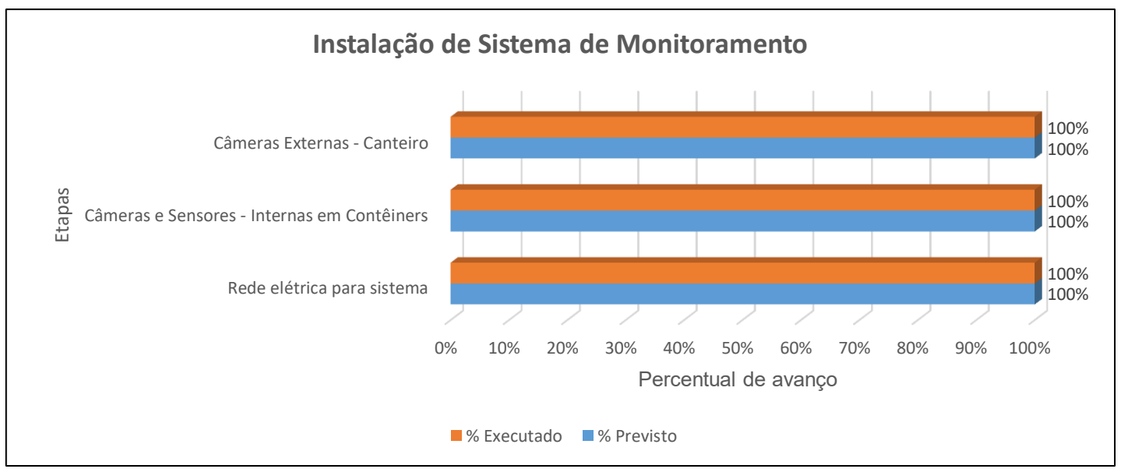

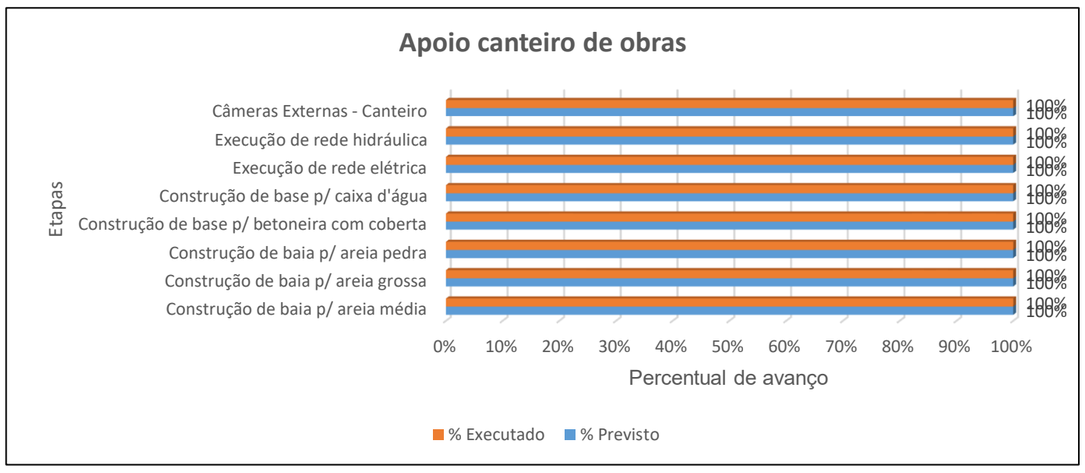

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
▲	Licenças	- Alvará: Previsão 30/08/2025. Pendente aprovação do Relatório de Impacto de Trânsito (AMMPLA). - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Depende da aprovação do Relatório de Impacto de Trânsito. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Anuência emitida em 09/07/2025. Submetido ao órgão competente.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- No canteiro de obras, as atividades estão concentradas na etapa de fundações. A empresa DVL, responsável pelo serviço de cravação de estacas, avança em ritmo acelerado, com previsão de conclusão ainda nesta semana, incluindo a desmobilização e a entrega do as-built do projeto. Paralelamente, já foi iniciada a aquisição de aço para corte e dobra. A montagem do primeiro dos seis blocos estruturais encontra-se em fase final, com a concretagem programada para o início da próxima semana. O projeto de contenções segue em desenvolvimento. Além disso, recebemos propostas para a aquisição de dois equipamentos: um policorte e uma serra de bancada.	Foi realizada uma segunda compra de excedente de materiais para fundação, no total +140m de trilhos TR-37. Projeto de contenções, prevê o transpasse por dentro dos blocos de coroamento das estacas, está em fase final de estudo, para formalidade do projeto. A empresa DVL deverá emitir relatório de conclusão de obra, atestando a finalização dos serviços.
●	Fornecedores	- DVL Fundações (Executora da Fundação): Deu sequência aos serviços de cravação de estacas metálicas durante todo o período, concluindo 76 dos 81 blocos previstos. A empresa sinalizou a necessidade de extensão do prazo, com nova previsão de término para 13/09/2025. - ENPRO (Estrutura Pré-moldada): Segue com a produção dos componentes da superestrutura, com previsão de início da montagem no canteiro para setembro/2025. Em 14/08/2025, a equipe de engenharia da ENPRO enviou o booking de projetos da estrutura para aprovação de fabricação. Em 09/09/25 recebemos a visita do encarregado de montagem da ENPRO. - Maciel Engenharia (Projetista): Formalizou em 06/08/2025 a oferta, sem custos, para a elaboração do projeto executivo das estruturas de contenções e dos pisos do térreo. - GM Topografia: executará a conferência do cravamento de estacas e gabarito da obra.	À equipe adm local segue monitorando os processos
