RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 30/09/2025
Quinzena Vigente 25Q19

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	14/12/2025
Término c/ aditivos:	
Término tendência	14/12/2025
Duração (dias)	230
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

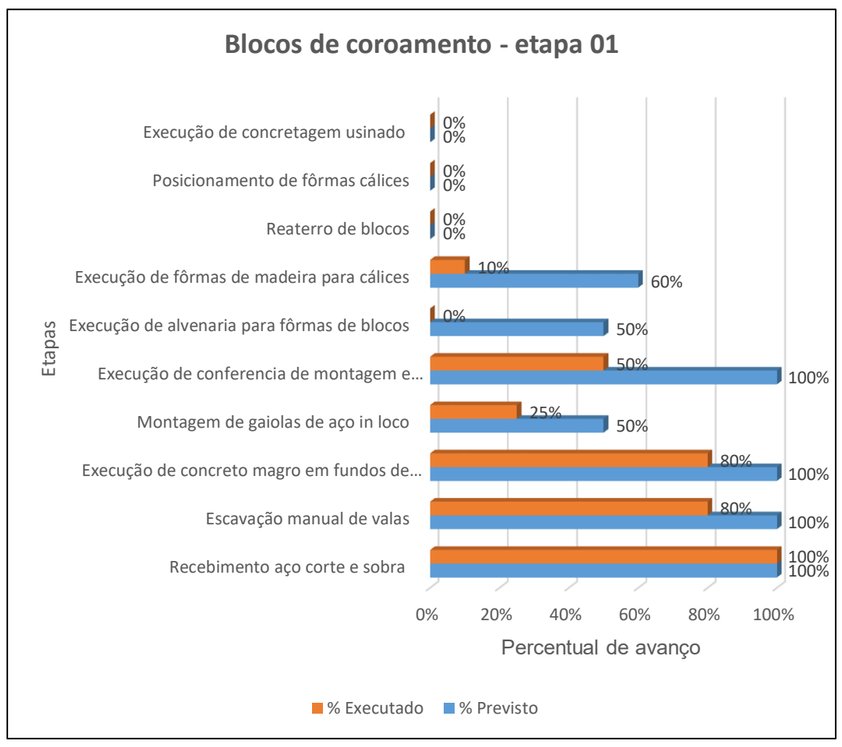

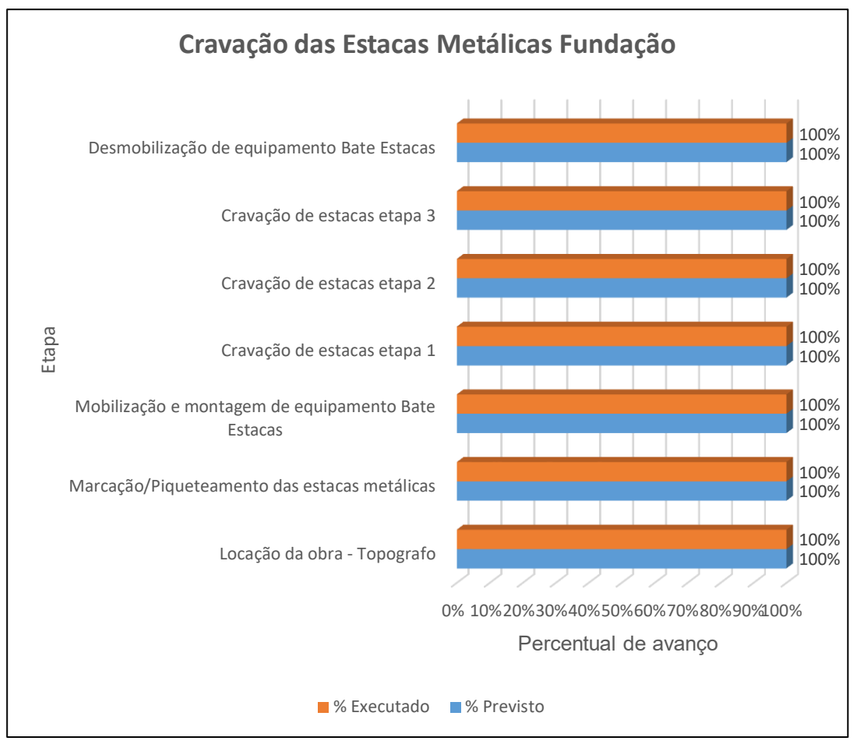

DIVERSOS

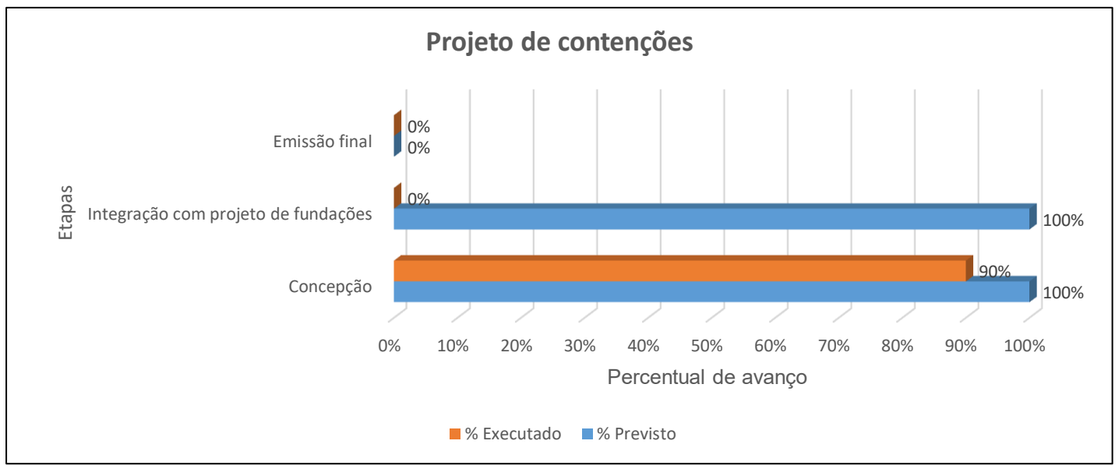

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
▲	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- Em canteiro, foi concluída a cravação das estacas no último dia 17/09 pela equipe DVL. É dado andamento a montagem das ferragens dos blocos de coroamento. Realizada revisão completa no gabarito da obra. Em andamento aplicação de solo-cimento no fundo das valas onde há presença de água do lençol freático. Sequência também na execução do concreto magro.	Estamos aguardando a conclusão do projeto de contenções emitido pela empresa Maciel Engrenharia para andamento na etapa.□
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa ENPRO iniciou o planejamento da produção da superestrutura pré-moldada, e uma visita técnica foi realizada para detalhar a complexa montagem. - Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia está finalizando os estudos do projeto de contenções, com prazo para envio das considerações técnicas até 26/09, para integração com o projeto das fundações. - AA87Topografia: A GM Topografia realizou a conferência da localização das estacas e a aferição do gabarito da obra, garantindo a precisão conforme os eixos e níveis do projeto.	À equipe adm local segue monitorando os processos
