RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 28/10/2025
Quinzena Vigente 25Q21

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	14/12/2025
Término c/ aditivos:	
Término tendência	14/12/2025
Duração (dias)	230
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	✓
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

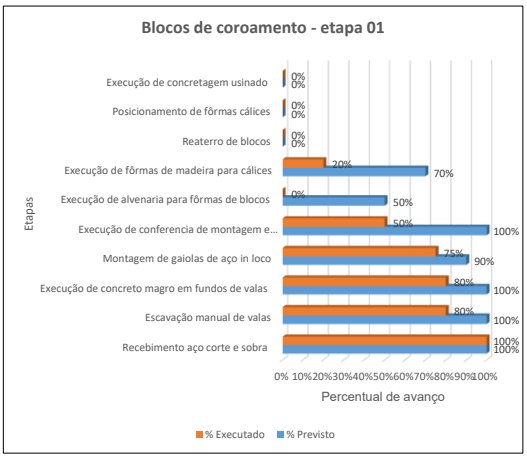

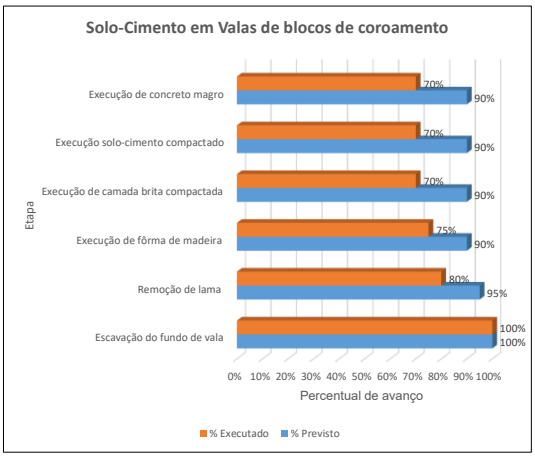

DIVERSOS

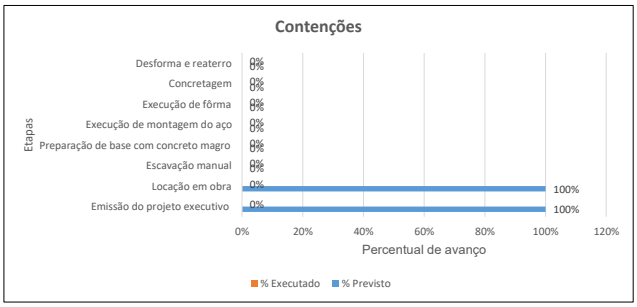

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
▲	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	'- Em canteiro, está em andamento a execução da revisão do gabarito da obra, remoção de lama do fundo de valas de forma manual, remoção de água do lençol freático com auxílio de moto bomba, execução de solo cimento no fundo de valas onde há presença de lençol freático (brita 10 cm, solo cimento 30~40cm, concreto magro), em andamento montagem do aço das gaiolas dos blocos de coroamento da etapa 1, rebaixamento de barreiras de forma manual.	Estamos aguardando a conclusão do projeto de contenções emitido pela empresa Maciel Engrenharia para andamento na etapa. Planjamento de proximas etapas: Corte e dobra do aço da etapa 02, fôrmas de alvenaria da etapa 01.□
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. - Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia concluiu o modelo e está a enviar o projeto executivo nos próximos dias, previsão para o dia 31/10/25. - Pedro Marcio: Escritório responsável pelos projetos de engenharia está a enviar as versões final nos próximos dias. O escritório rescindiu o contrato, a adm da igreja já está em contato com outro escritório para sequencia nos projetos. - GM topografia com previsão de realização de conferência de cotas de implantação para o próximo dia 31/10/25.□	Em 07 e 08 de outubro ocorreu a visita aos fornecedores e parceiros do cap 2 em salvador, realizada pelo eng Rafael e pastor Ronan.
