RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 25/11/2025
Quinzena Vigente 25Q23

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967

Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	✓

Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

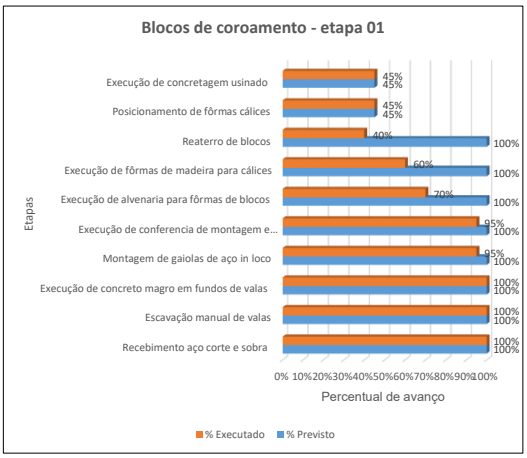

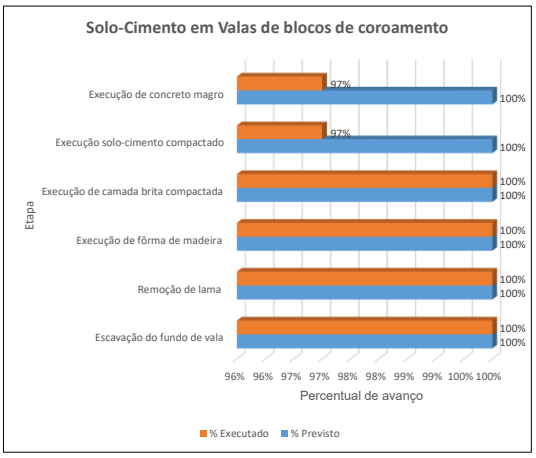

DIVERSOS

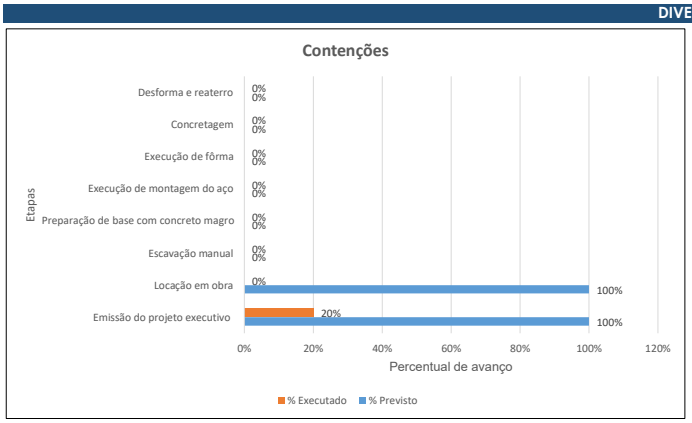

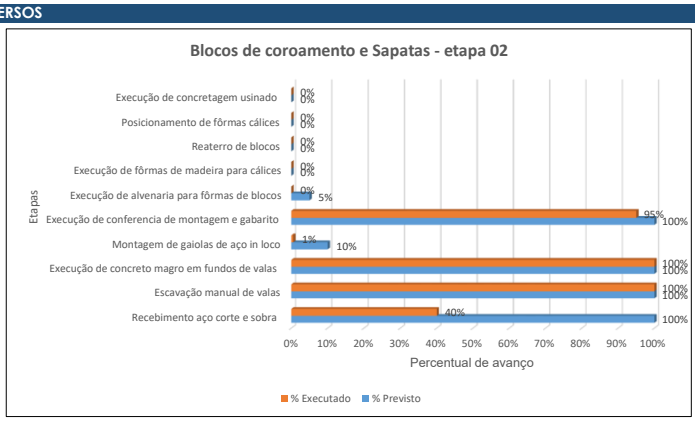

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
●	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	– Em canteiro, foi realizado a concretagem de 9 dos 81 blocos de coroamento da etapa 01. Iniciado a armação das gaiolas de aço dos blocos de coroamento da etapa 02, sequência na execução de fôrmas de alvenaria dos blocos de coroamento da etapa 01 (para concluir a etapa de concretagem dos últimos 10 blocos). Rebaixamento de barreiras de forma manual. Execução de concreto magro na etapa 02. Drenagem de água do lençol freático com auxílio de moto bomba.	Estamos aguardando a conclusão do projeto de contenções emitido pela empresa Maciel Engrenharia para andamento na etapa.
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia concluiu o modelo e está a enviar o projeto executivo nos próximos dias, previsão para o dia 31/10/25, não foi enviado. Recebido parcial do projeto para plano de escavações em 14/11/25. - Facilitas: Recebemos em 06/11/25 visita da engenharia coordenadora de projetos, no qual realizou visita também na estrutura atual da igreja. Conforme solicitação foi enviado por Rafael arquivo referente a obra para que possam dar andamento as emissões.□ - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. Realizado concretagem em 19/11/25 de 31m³ de concreto em 9 de 81 blocos de coroamento com bomba estacionária. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias.	Seguimos acompanhados atividades de terceiros para a garantia de execução dos escopos contratados.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	✓
PPRA	✓
PCMSO	✓
ASO	✓
FICHAS DE EPI	✓
FICHAS DE REGISTRO	✓

CANTEIRO	
Status Geral	!
EPI	✓
EPC	✓
TRABALHO EM ALTURA	!
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	✓
EQUIPAMENTOS	✓

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
