RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 06/01/2026
Quinzena Vigente 26Q01

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	✓

Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

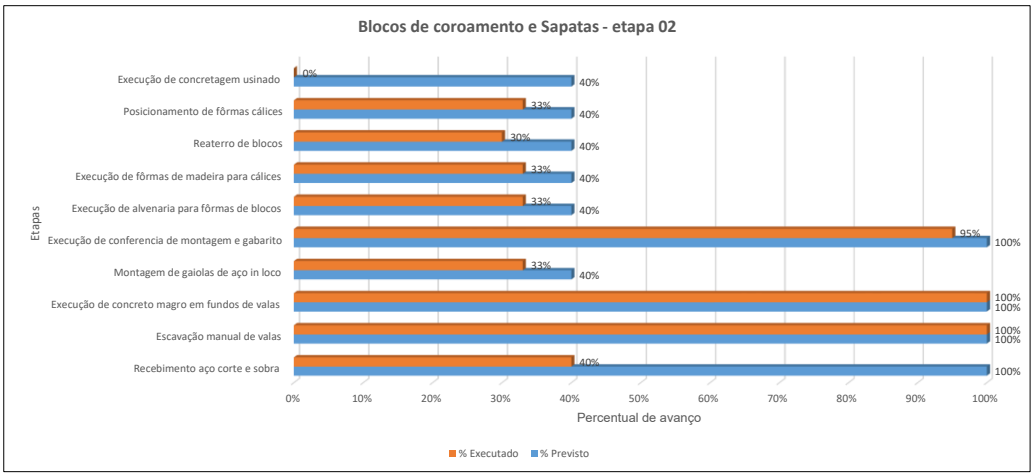

DIVERSOS

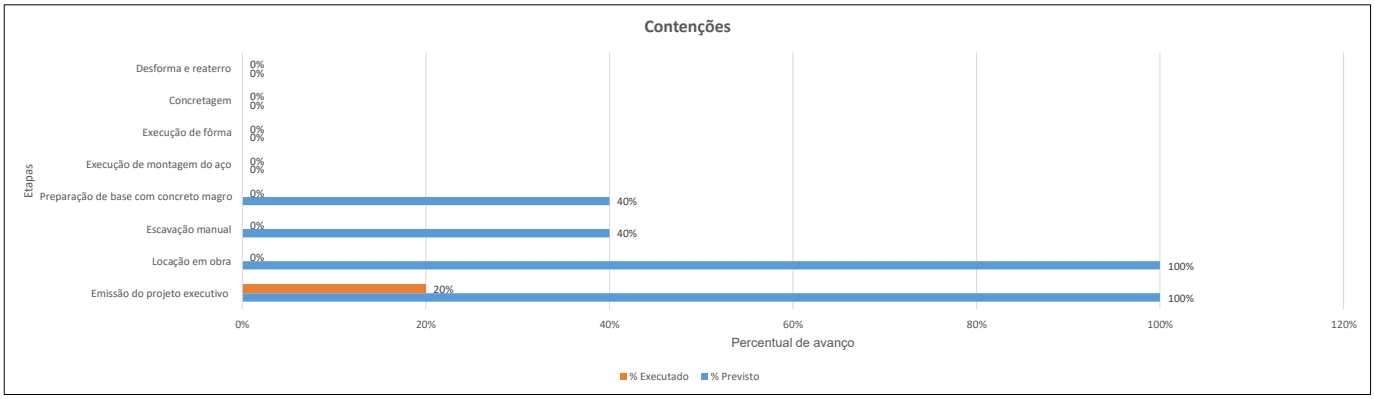

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
●	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- Em canteiro, está em andamento preparação de blocos de coroamento para concretagem na etapa 02, com o processo completo de montagem de gaiolas de aço, execução de fôrmas perdidas de alvenaria, execução de fôrmas tipo cálice de madeira, conferências de eixo, reaterros etc, agendado a 1° concretagem da etapa 02 para o dia 08/01/26 com um total de 37m³ de concreto, 10 blocos. Em paralelo é feito planejamento para compra do aço da etapa 03.	Estamos aguardando a conclusão do projeto de contenções emitido pela empresa Maciel Engrenharia para andamento na etapa, atividades in loco e contações de materiais.
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia concluiu o modelo e está a enviar o projeto executivo nos próximos dias, previsão para o dia 31/10/25, não foi enviado. Recebido parcial do projeto para plano de escavações em 14/11/25. - Facilitas: Recebemos em 28/11 e 09/12 relatórios de estudos preliminares sobre concepção e análises dos futuros projetos. - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. Realizado concretagem em 19/11/25 e 10/12/25. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias.	Seguimos acompanhados atividades de terceiros para a garantia de execução dos escopos contratados.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	✓
PPRA	✓
PCMSO	✓
ASO	✓
FICHAS DE EPI	✓
FICHAS DE REGISTRO	✓

CANTEIRO	
Status Geral	!
EPI	✓
EPC	✓
TRABALHO EM ALTURA	!
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	✓
EQUIPAMENTOS	✓

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
