RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 03/02/2026
Quinzena Vigente 26Q03

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967

Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	✓

Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

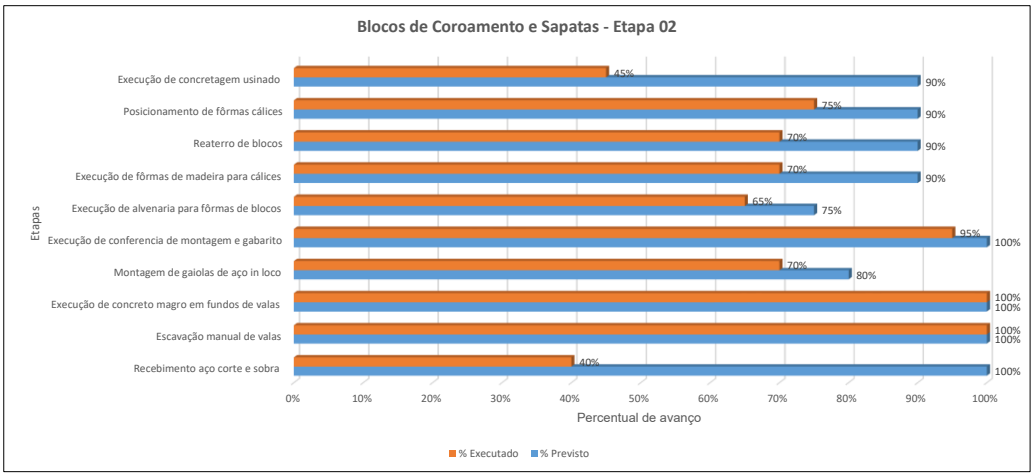

DIVERSOS

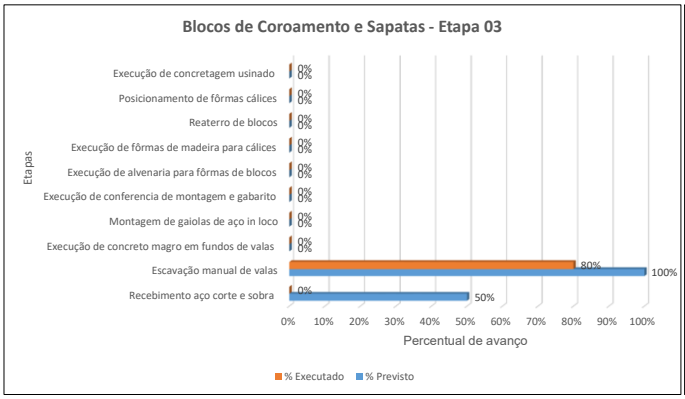

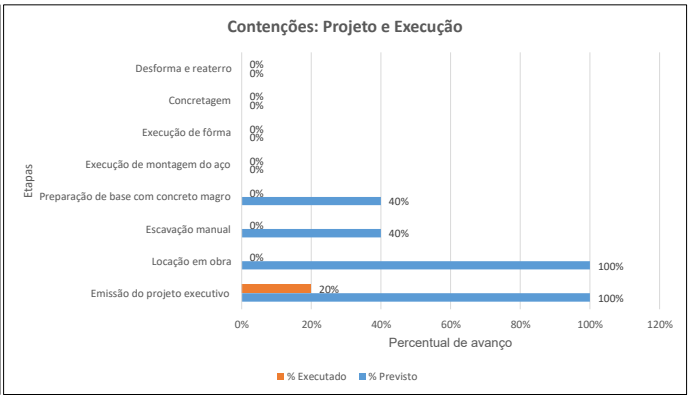

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
●	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- - Em canteiro, está em andamento preparação de blocos de coroamento para concretagem finais na etapa 02, com o processo completo de montagem de gaiolas de aço, execução de fôrmas perdidas de alvenaria, execução de fôrmas tipo cálice de madeira, conferências de eixo, reaterros etc., Previsão de sinalização das concretagens da etapa a02 para 02/26. Em paralelo é feito planejamento para compra do aço da etapa 03. Aguardando até o dia 12/02/26 o recebimento do projeto executivo de contenções para sequência de planejamentos.	Estamos aguardando a conclusão do projeto de contenções emitido pela empresa Maciel Engrenharia para andamento na etapa, atividades in loco e contações de materiais.
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia concluiu o modelo e está a enviar o projeto executivo nos próximos dias, previsão para o dia 31/10/25, não foi enviado. Recebido parcial do projeto para plano de escavações em 14/11/25. Foi informado que o projeto está a ser enviado em 12/02/26 - Facilitas: Recebemos em 28/11 e 09/12 relatórios de estudos preliminares sobre concepção e análises dos futuros projetos. - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias.	Seguimos acompanhados atividades de terceiros para a garantia de execução dos escopos contratados.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	✓
PPRA	✓
PCMSO	✓
ASO	✓
FICHAS DE EPI	✓
FICHAS DE REGISTRO	✓

CANTEIRO	
Status Geral	!
EPI	✓
EPC	✓
TRABALHO EM ALTURA	!
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	✓
EQUIPAMENTOS	✓

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
