RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 23/06/2026
Quinzena Vigente 26Q13

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

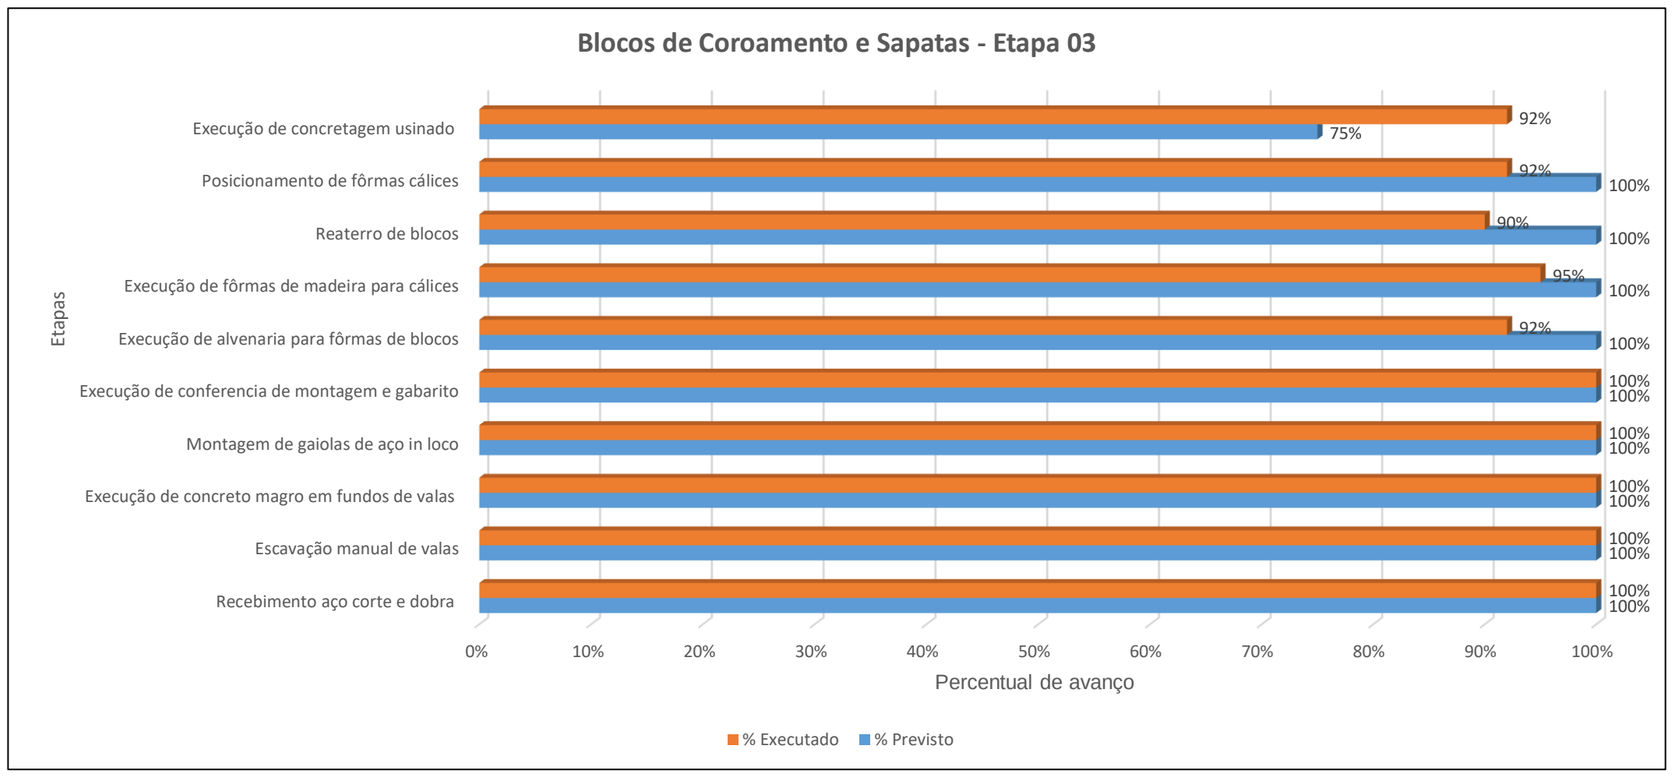

DIVERSOS

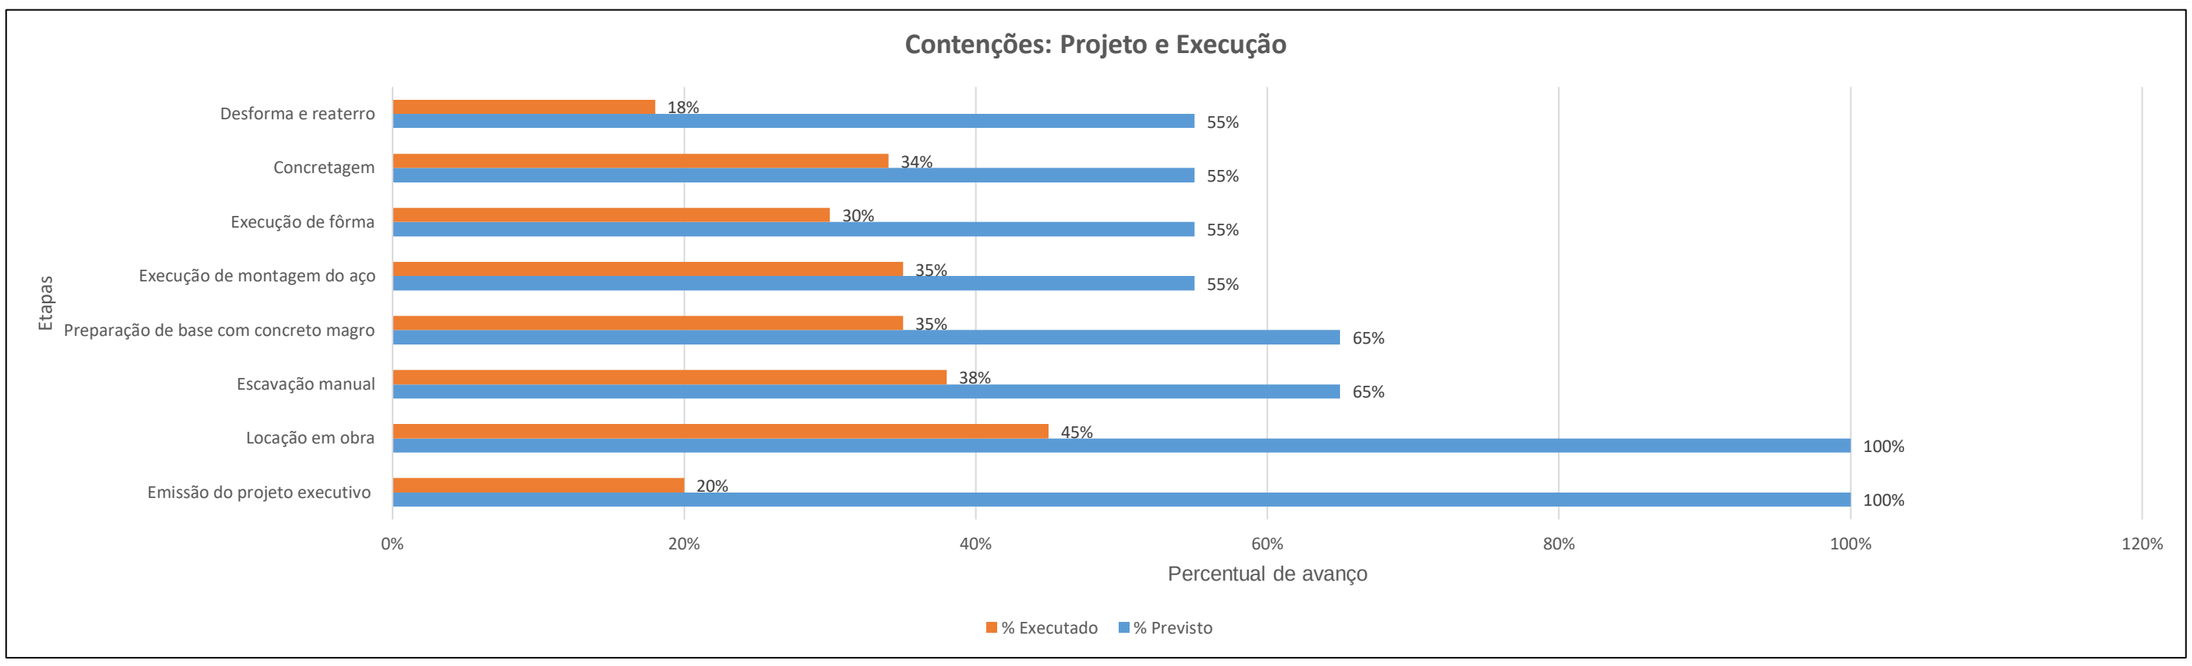

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
●	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- No canteiro, foram executadas posicionamentos de fôrmas tipo cálice em blocos de coroamento, além da execução de formas perdidas de alvenaria em blocos de coroamento em sapatas. Foi executado o reaterro lateral dos blocos de coroamento para servir como contenção na hora da concretagem, etapa 3. Na etapa de contenções foram executadas cortes, dobras e montagem de aço para sapatas corridas e paredes estruturadas. Foram executadas concretagens de paredes estruturadas etapa de contenções. Em 19/06/26 foi executado a última concretagem usinada de blocos de coroamento e sapatas.	Equipe de engenharia alerta a adm da igreja com relação a necessidade de reposições na equipe. Também é alertado sobre a necessidade do recebimento dos projetos executivos das disciplinas de engenharia da igreja de jovens e estruturas auxiliares. Até a data do fechamento desse relatório segue pendente os recebimentos dos projetos executivos.
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Aguardamos os projetos executivos - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias.	Com a finalização das concretagens dos blocos de coroamento e sapatas se faz necessário a conferência de eixos e de cotas de níveis das peças concretadas, esse trabalho deve ser feito por uma empresa de topografia.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	●
PPRA	●
PCMSO	●
ASO	●
FICHAS DE EPI	●
FICHAS DE REGISTRO	●

CANTEIRO	
Status Geral	!
EPI	●
EPC	●
TRABALHO EM ALTURA	!
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	●
EQUIPAMENTOS	●

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
