RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 07/07/2026
Quinzena Vigente 26Q14

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

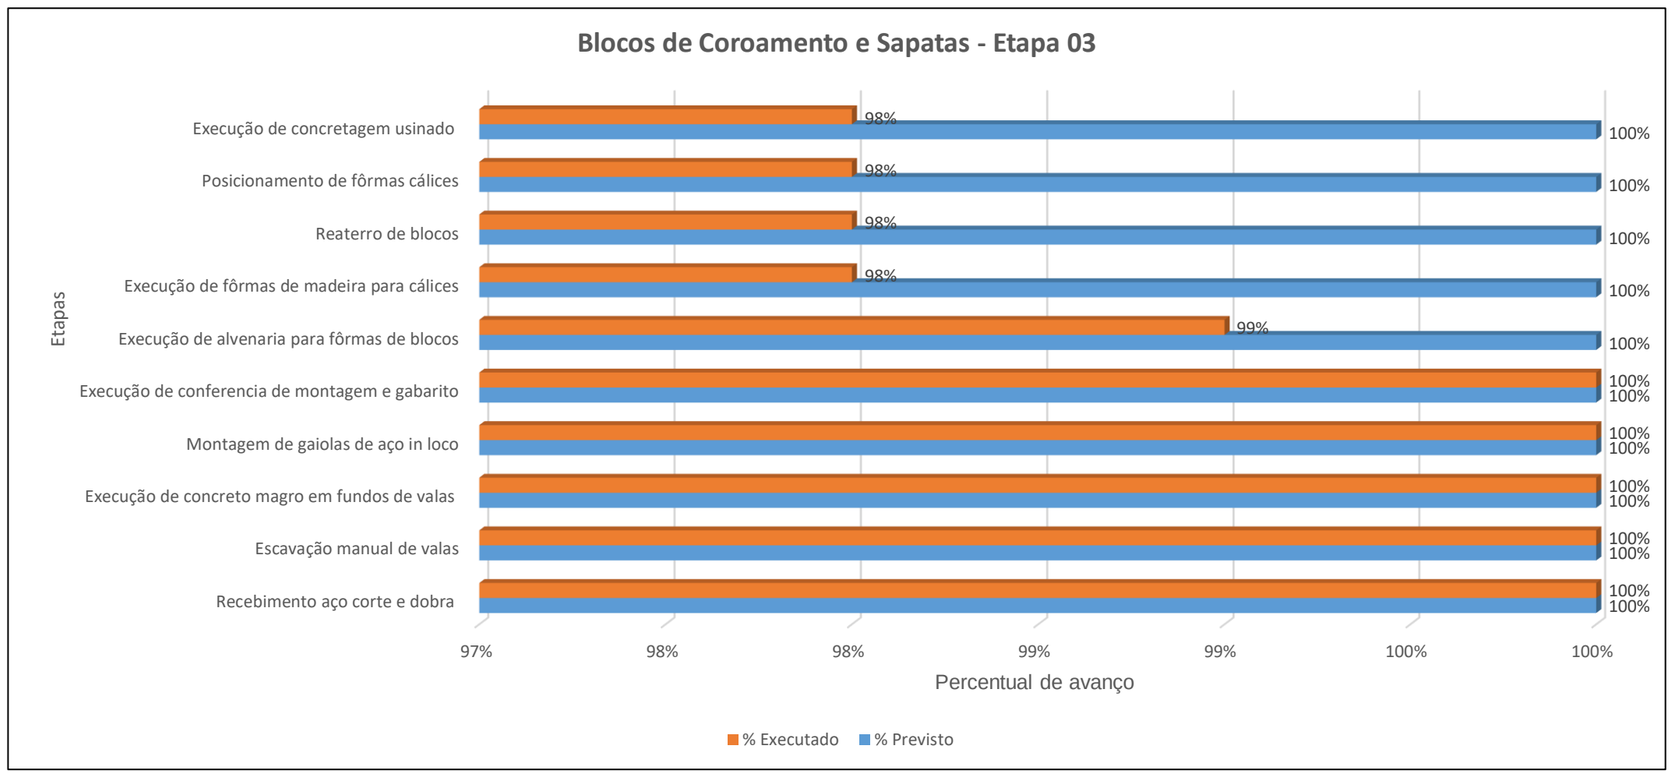

DIVERSOS

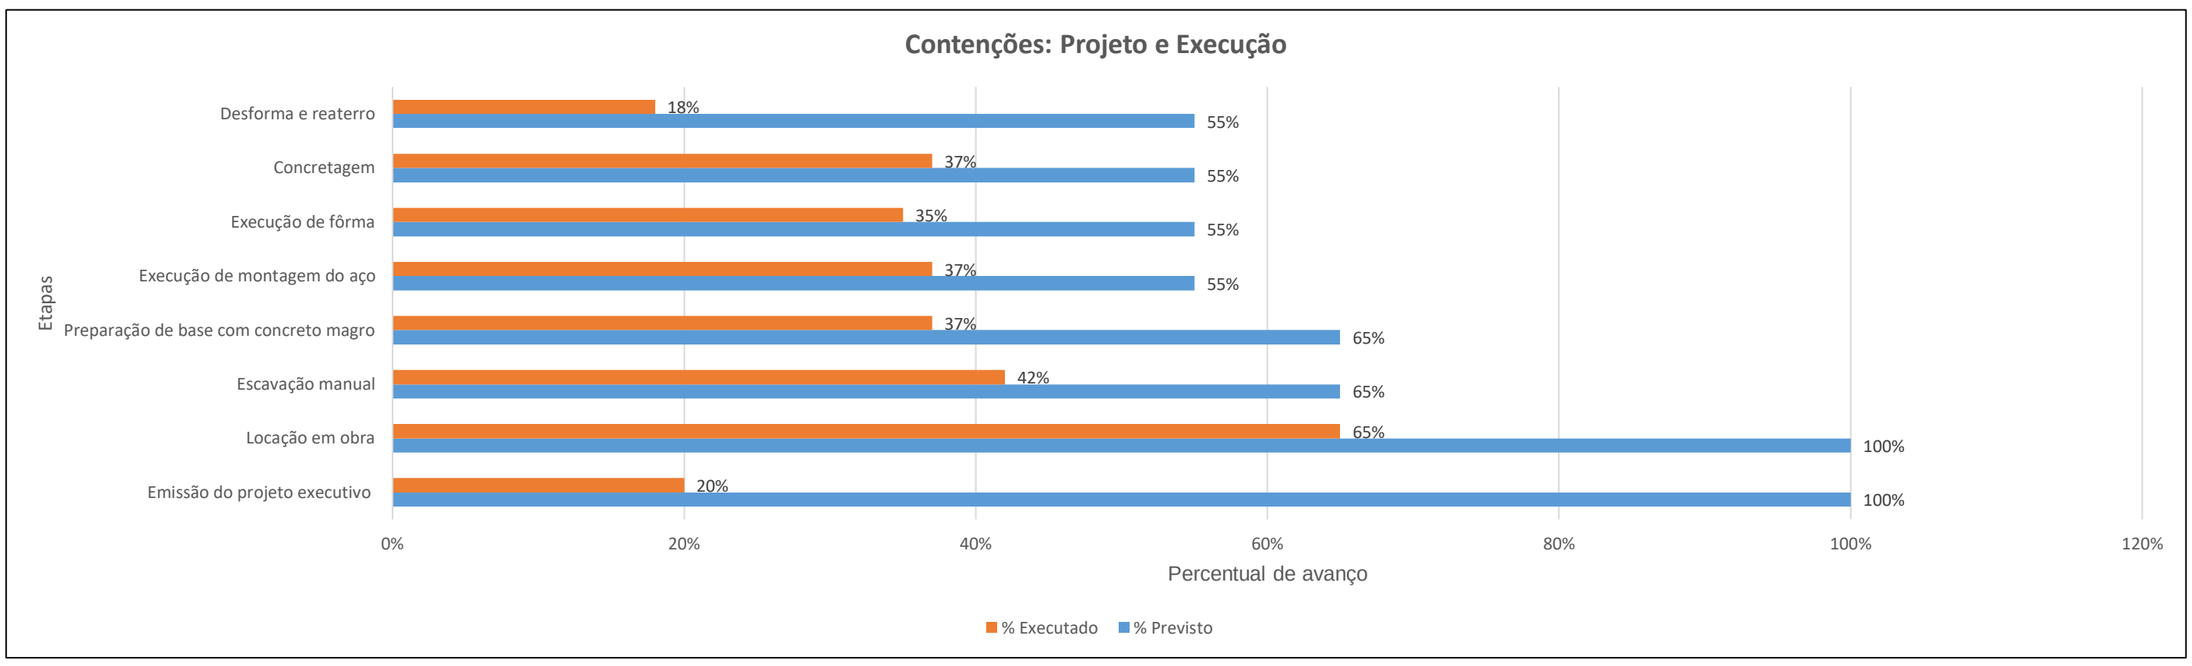

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
●	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- No canteiro de obras as atividades seguem com etapa final dos blocos de coroamento, produção de fôrmas de madeira para cálice de sapata de fundação, concretagem de cálices com concreto moldado em obra. Na etapa de contenção seguimos com escavações manuais, execução de concreto magro, corte, dobra e montagem de aço, execução de parede estrutural de alvenaria estrutural preenchida com concreto e fios de aço.	Equipe de engenharia alerta a adm da igreja com relação a necessidade de reposições na equipe. Também é alertado sobre a necessidade do recebimento dos projetos executivos das disciplinas de engenharia da igreja de jovens e estruturas auxiliares. Até a data do fechamento desse relatório segue pendente os recebimentos dos projetos executivos.
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Aguardamos os projetos executivos - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias.	Aguardamos finalização de todos os blocos para que empresa de topografia venha realizar levantamento em canteiro

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	●
PPRA	●
PCMSO	●
ASO	●
FICHAS DE EPI	●
FICHAS DE REGISTRO	●

CANTEIRO	
Status Geral	!
EPI	●
EPC	●
TRABALHO EM ALTURA	!
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	●
EQUIPAMENTOS	●

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
