RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 13/10/2026
Quinzena Vigente 26Q21

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967

Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	

Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

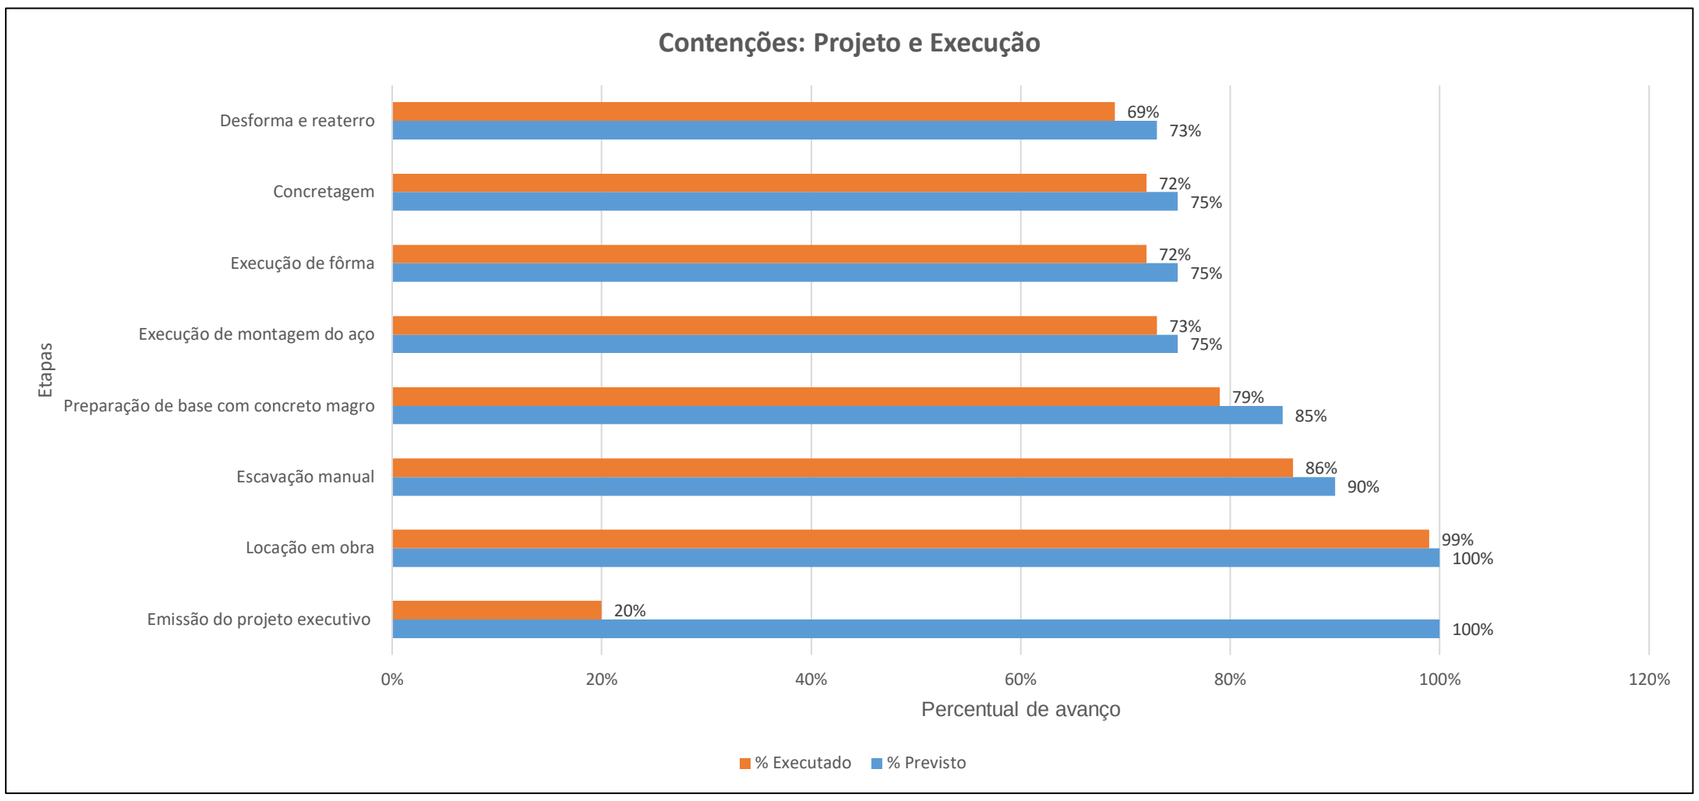

DIVERSOS

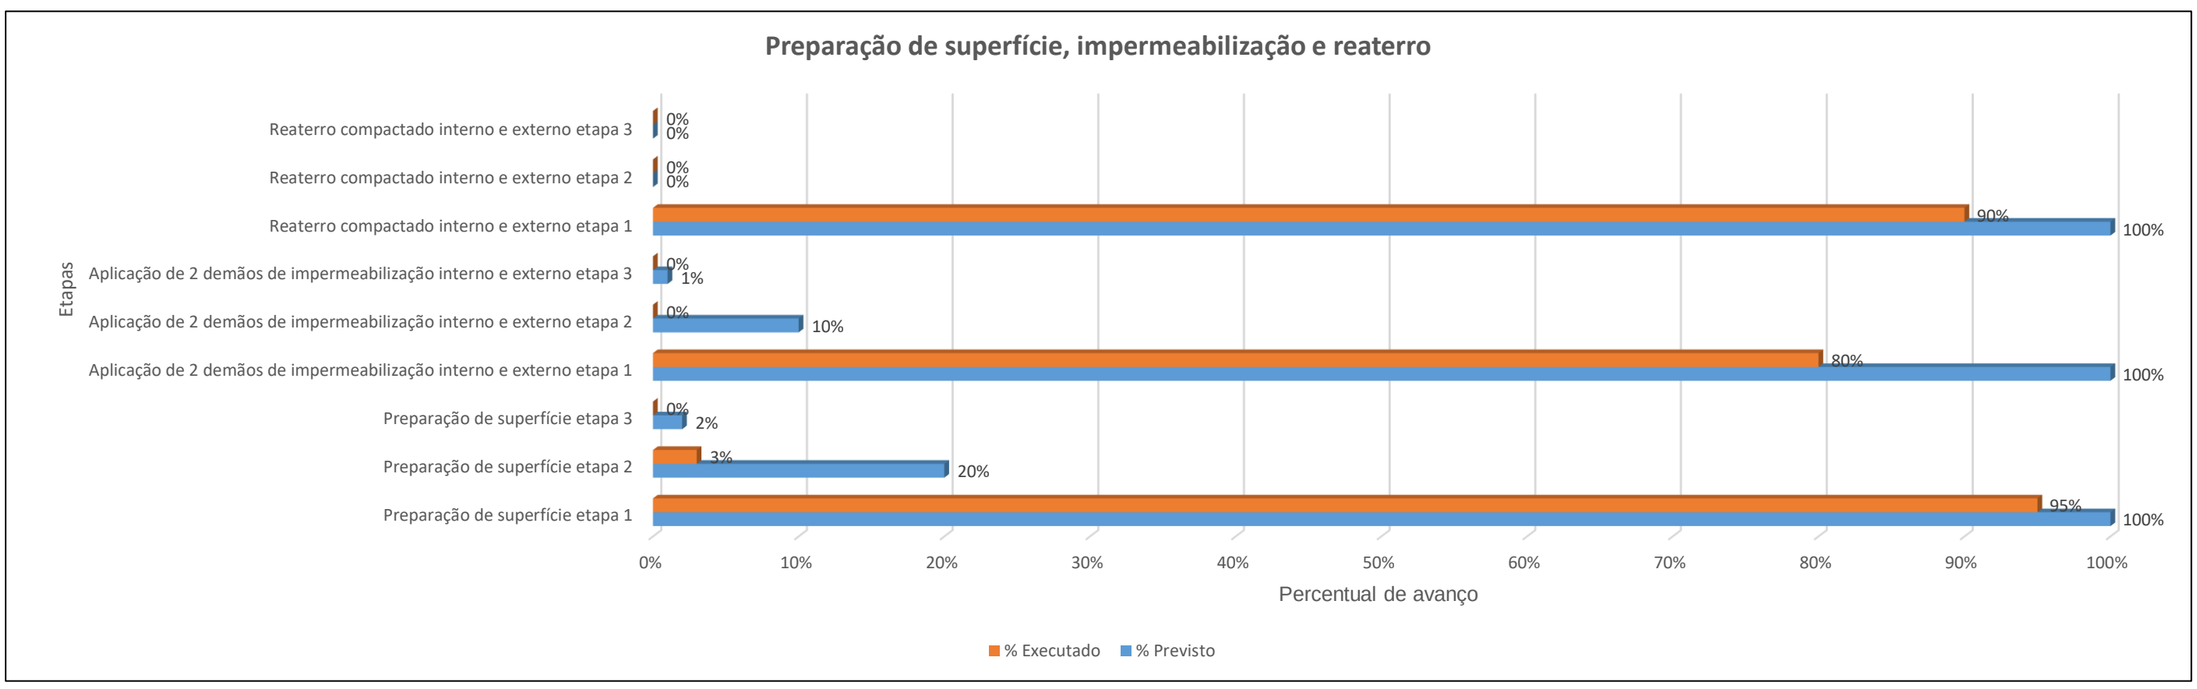

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos. Solicitado pela equipe de engenharia a verificação de validade das licenças da obra, no intuito de manter tudo regularizado.
	Atividades	- Avanço físico na execução da etapa de contenção, com escavação manual de vala, execução de lastro de concreto magro, execução de estaca escavada (corte, dobra e montagem de a ferragem e concretagem), corte, dobra e montagem de armadura para esteira corrida, concretagem de esteira corrida, execução de parede estrutural com blocos de cimento, preenchidas com concreto e fios de aço para estruturação. Aço 10mm e 12,5mm.	Face solicitado da diretoria, em conclusão da etapa parcial de contenções para outubro, foi realizada a contratação de 1 pedreiro e 1 ajudante, no intuito de repor a equipe, também foi autorizada os trabalhos aos sábados, no intuito de celeridade no serviço. A equipe de engenharia, alertou em 07/10/26 que mesmo que esse planejamento, possa ser que não consigamos alcançar a meta, face o volume de serviços e total de pessoas disponíveis.
	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Depois varias tratativas, foi formalizado via e-mail que em até 21/10/26 todos os projetos seriam enviados. - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias. - Topógrafo realizou levantamento in loco de peças concretadas para aferição detalhadas do previsto versus executado	- A equipe de engenharia recebeu e enviou para ENPRO o levantamento pós concretagem de uma 2º empresa de topografia, uma vez que, a 1º empresa que executou desde o início realizou algumas aferições/locações equivocadas, assim compromete a qualidade da obra.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	
PPRA	
PCMSO	
ASO	
FICHAS DE EPI	
FICHAS DE REGISTRO	

CANTEIRO	
Status Geral	
EPI	
EPC	
TRABALHO EM ALTURA	
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	
EQUIPAMENTOS	

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
