RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 27/10/2026
Quinzena Vigente 26Q22

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

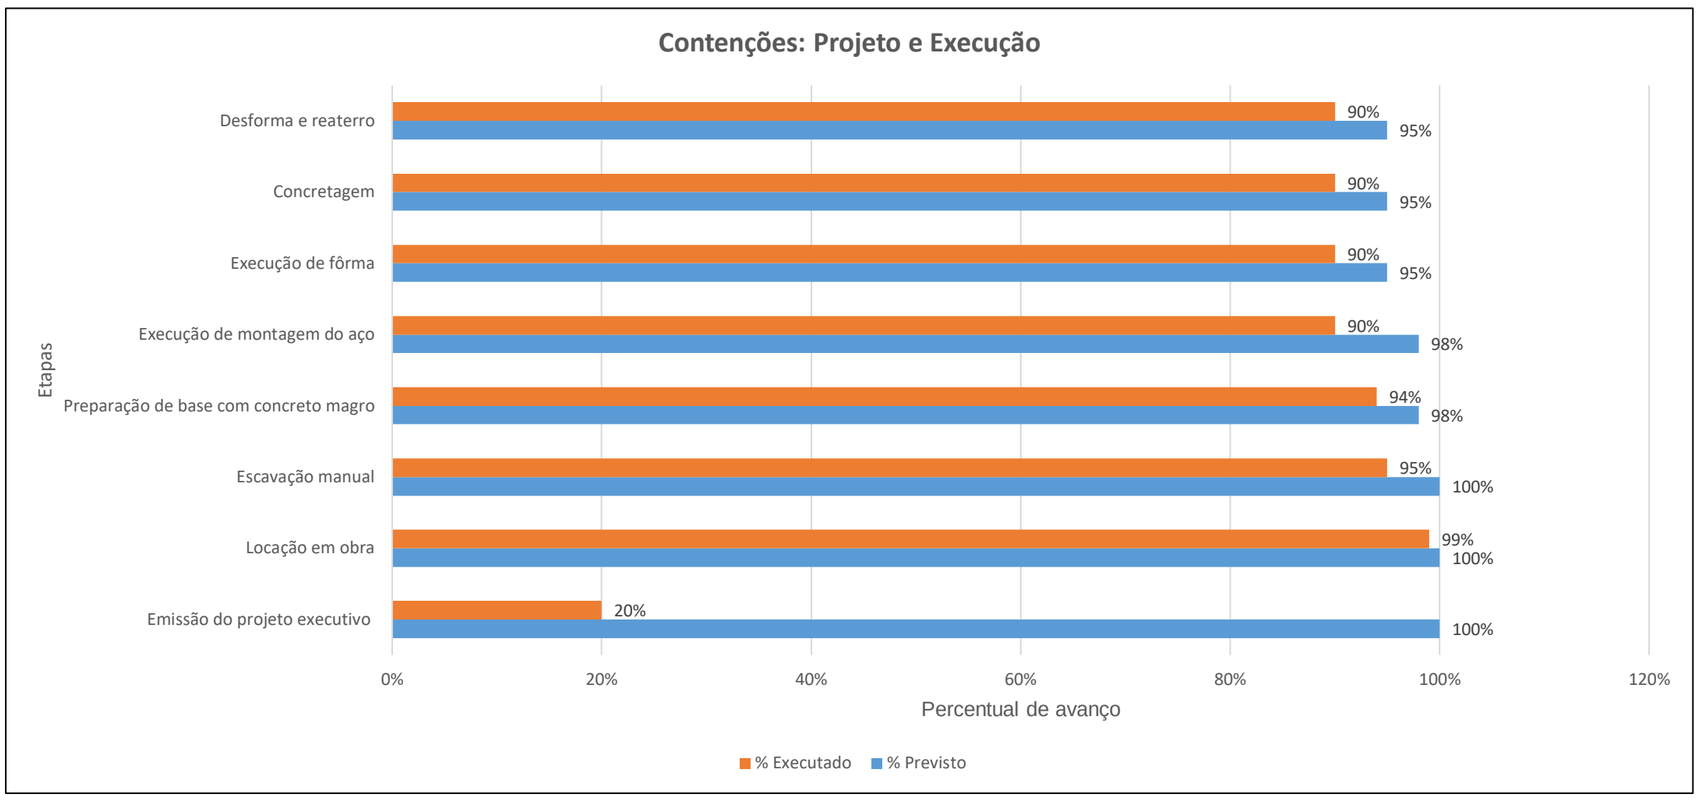

DIVERSOS

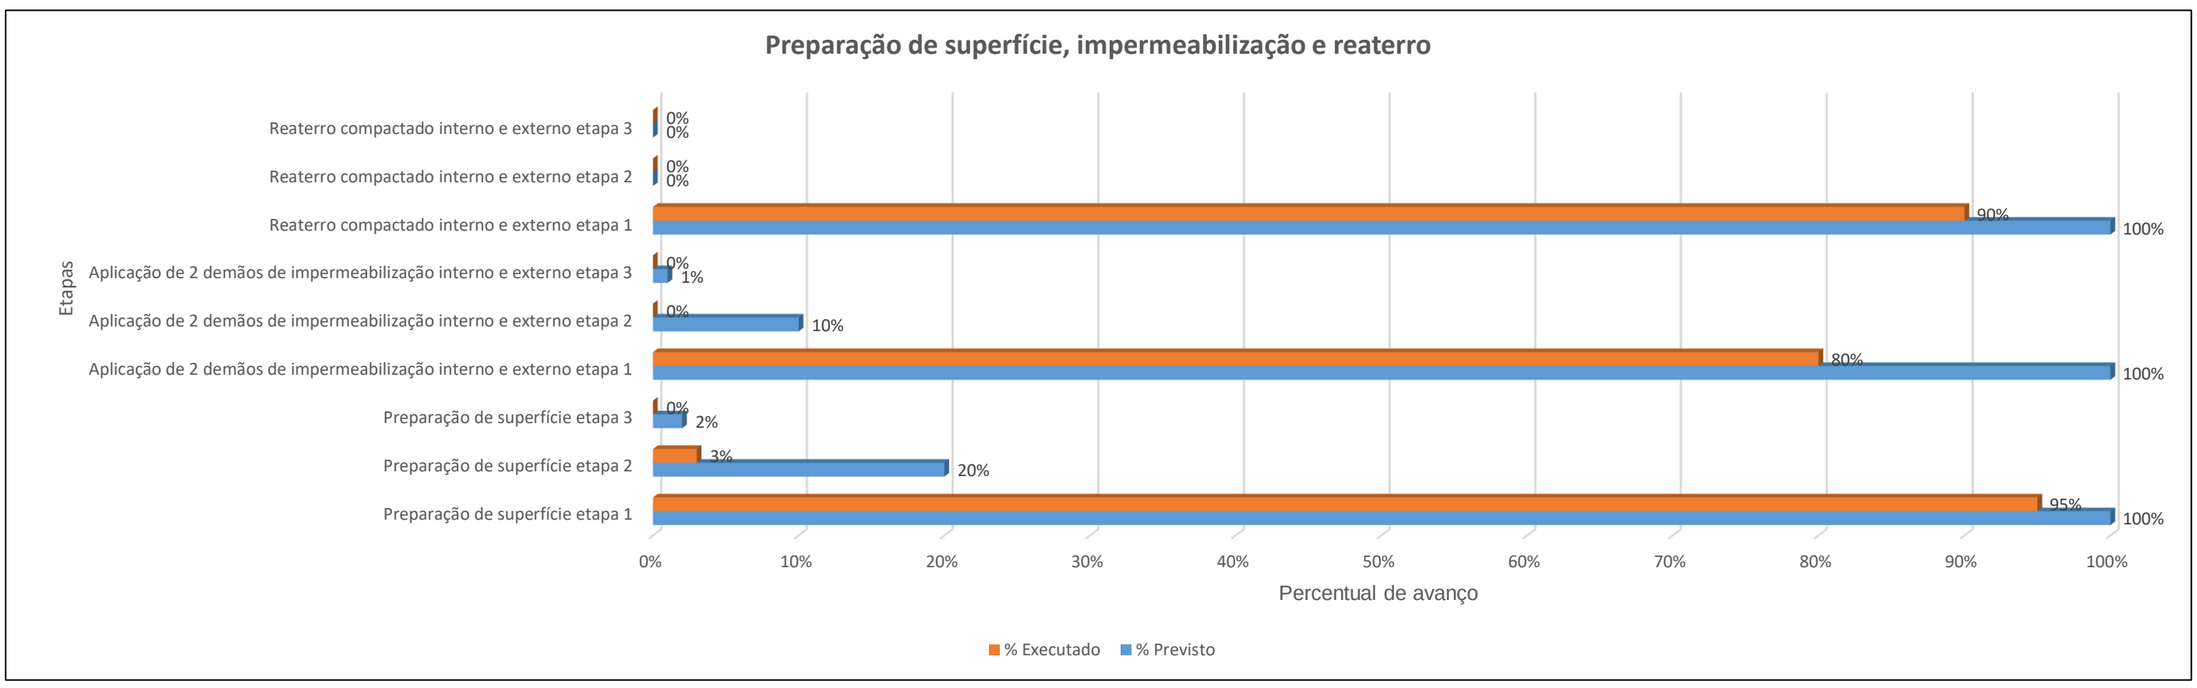

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
●	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos. Solicitado pela equipe de engenharia a verificação de validade das licenças da obra, no intuito de manter tudo regularizado.
●	Atividades	- Avanço físico na execução da etapa de contenção, com escavação manual de vala, execução de lastro de concreto magro, execução de estaca escavada (corte, dobra e montagem de a ferragem e concretagem), corte, dobra e montagem de armadura para esteira corrida, concretagem de esteira corrida, execução de parede estrutural com blocos de cimento, preenchidas com concreto e fios de aço para estruturação. Aço 10mm e 12,5mm.	Face solicitado da diretoria, em conclusão da etapa parcial de contenções para outubro, foi realizada a contratação de 1 pedreiro e 1 ajudante, no intuito de repor a equipe, também foi autorizada os trabalhos aos sábados, no intuito de celeridade no serviço. A equipe de engenharia, alertou em 07/10/26 que mesmo que esse planejamento, possa ser que não consigamos alcançar a meta, face o volume de serviços e total de pessoas disponíveis. Conforme previsto, e informado, no fim do mês de outubro a etapa de contenções não foi atingida, restando as paredes estruturais de concreto, rebocos internos,
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Depois varias tratativas, foi formalizado via e-mail que em até 21/10/26 todos os projetos seriam enviados. - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias. - Topógrafo realizou levantamento in loco de peças concretadas para aferição detalhadas do previsto versus executado.	- A equipe de engenharia recebeu e enviou para ENPRO o levantamento pós concretagem de uma 2º empresa de topografia, uma vez que, a 1º empresa que executou desde o início realizou algumas aferições/locações equivocadas, assim compromete a qualidade da obra.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	●
PPRA	●
PCMSO	●
ASO	●
FICHAS DE EPI	●
FICHAS DE REGISTRO	●

CANTEIRO	
Status Geral	●
EPI	●
EPC	●
TRABALHO EM ALTURA	●
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	●
EQUIPAMENTOS	●

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
