RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 10/11/2026
Quinzena Vigente 26Q23

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	21/12/2027
Término c/ aditivos:	
Término tendência	21/12/2027
Duração (dias)	967
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	✓
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

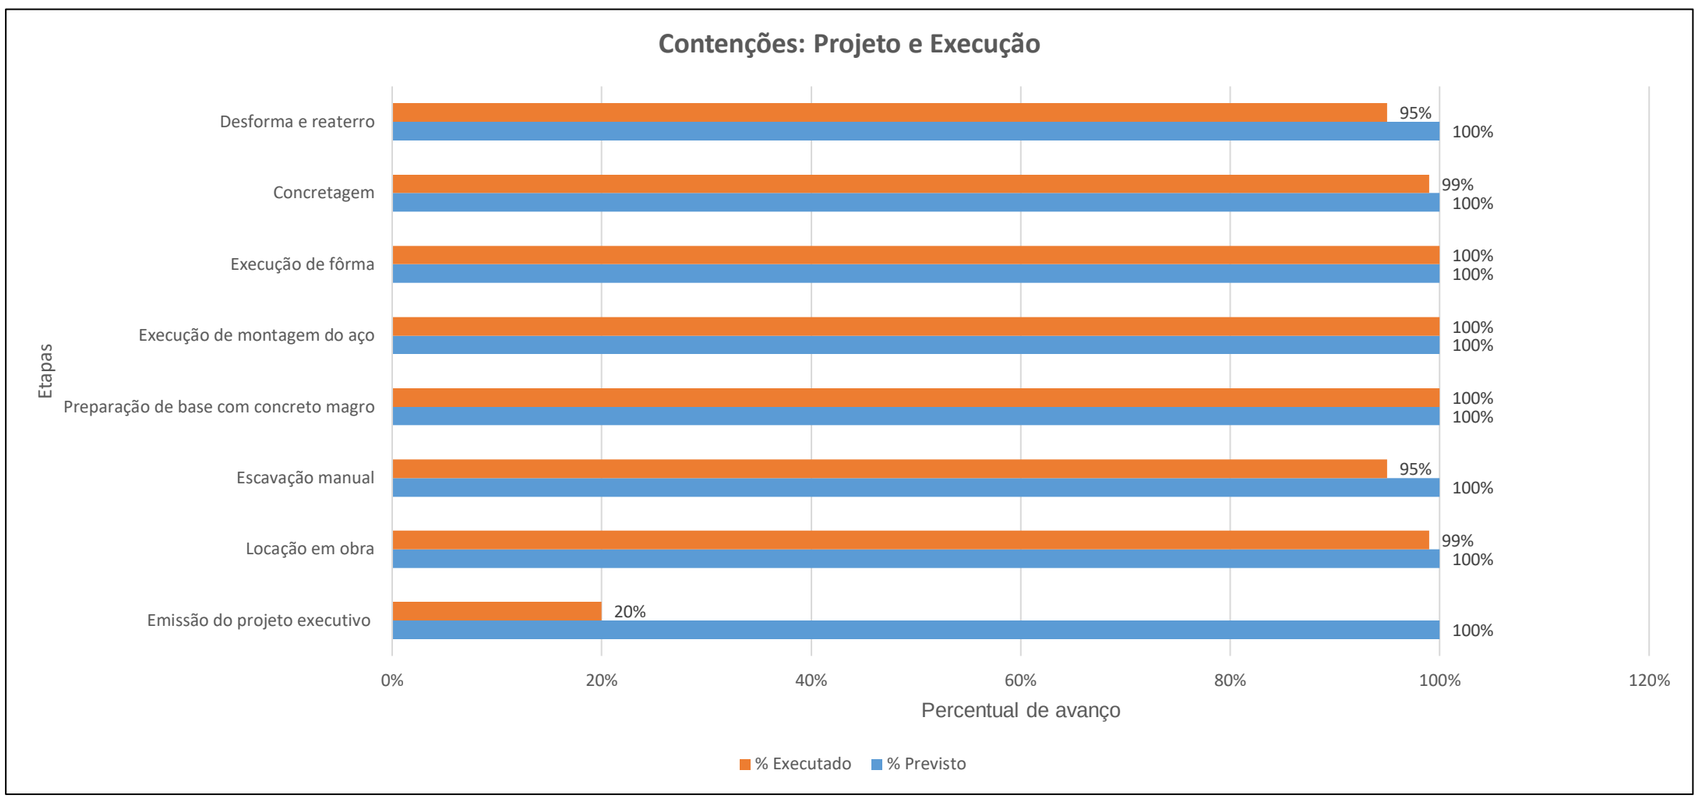

DIVERSOS

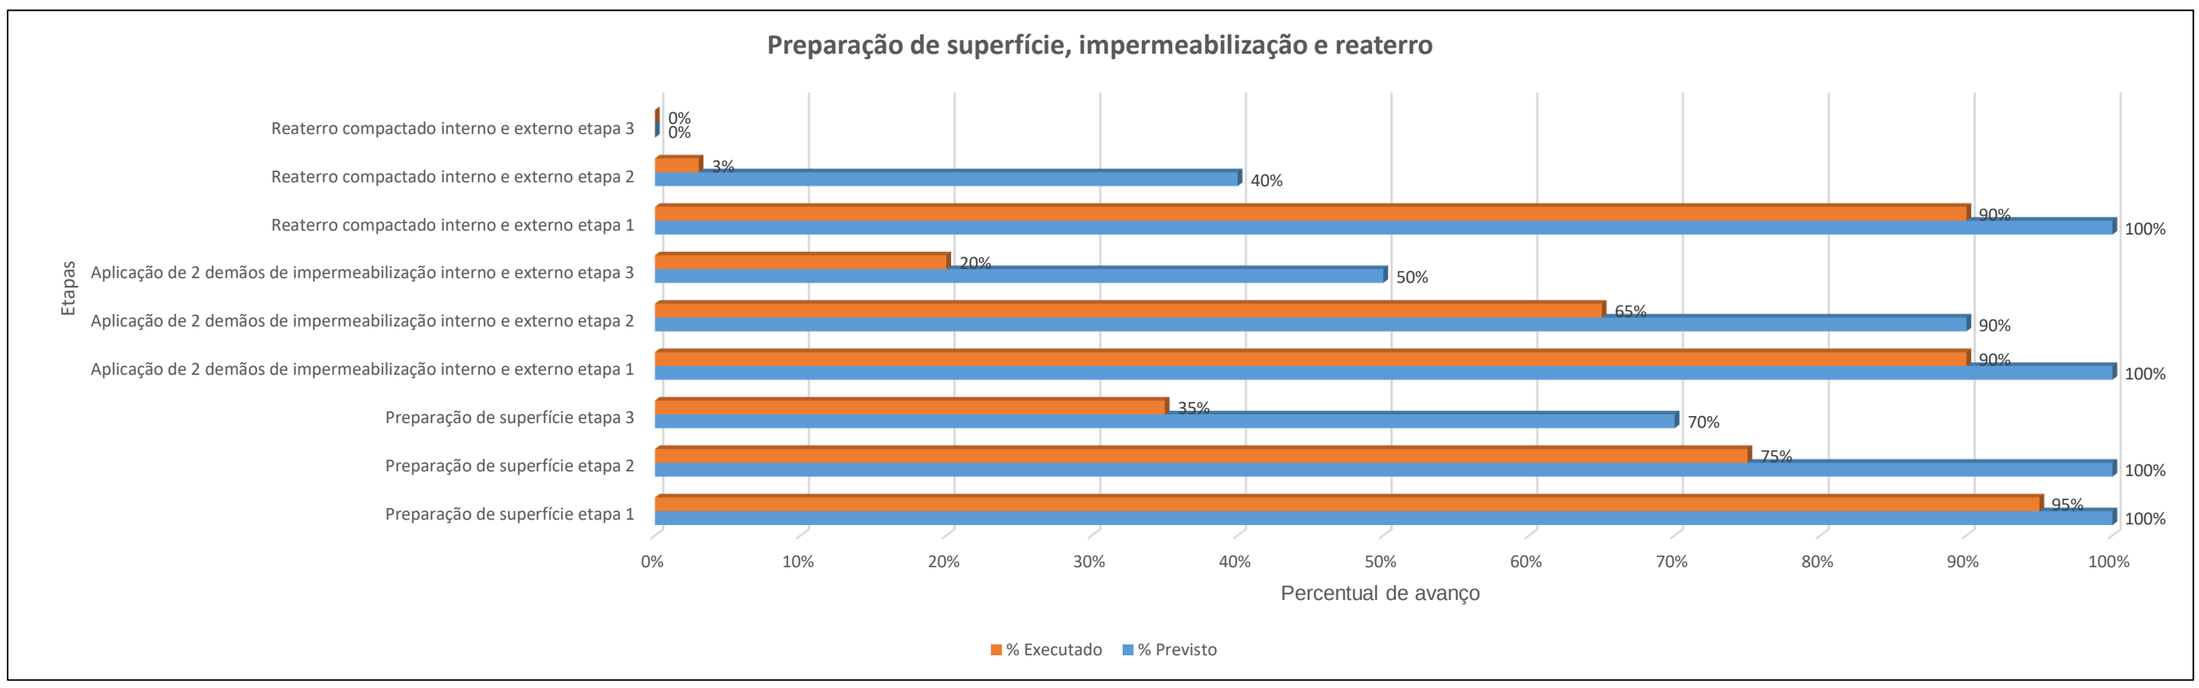

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
●	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos. Solicitado pela equipe de engenharia a verificação de validade das licenças da obra, no intuito de manter tudo regularizado.
●	Atividades	- Em canteiro, foi concluída a etapa de bases (sapatas corridas) da contenção, seguimos com a execução das paredes estruturais com blocos de cimento e fios de aço, foi iniciado a aplicação do reboco interno nas paredes de contenção para que seja possível aplicação de camada de impermeabilização. Está em andamento a remoção parcial do gabarito da obra. Previsão de que na semana do dia 09/11 seja mobilizado uma retroescavadeira e uma caçamba para que haja movimentação de solo, trazendo regularização ao entorno da obra.	No presente da de fechamento desse relatório, a etapa de contenção atingiu 87% de avanço físico, avanço macro em 13% e etapa de fundação 95,5%. Indicadores que mostram um retardo no alvo de outubro/26 que seria a conclusão da etapa. A equipe segue empenhada com planejamento técnico, metas e sequencia executiva definida para mitigar e concluir a etapa.
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. Previsão para 2026. - Facilitas: No mês de maio recebemos projetos de elétrica, sistemas eletrônicos, sanitário, hidráulico em seu modelo básico. Depois varias tratativas, foi formalizado via e-mail que em até 21/10/26 todos os projetos seriam enviados. - Massa Fort: Fornecedor de concreto usinado. - Delta: Responsável pelo controle tecnológico, coleta e ensaio de resistência a compressão em 28 dias. - Topógrafo realizou levantamento in loco de peças concretadas para aferição detalhadas do previsto versus executado.	- A equipe de engenharia recebeu e enviou para ENPRO o levantamento pós concretagem de uma 2º empresa de topografia, uma vez que, a 1º empresa que executou desde o início realizou algumas aferições/locações equivocadas, assim compromete a qualidade da obra.

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde

DOCUMENTAÇÃO	
Status Geral	✓
PPRA	✓
PCMSO	✓
ASO	✓
FICHAS DE EPI	✓
FICHAS DE REGISTRO	✓

CANTEIRO	
Status Geral	✓
EPI	✓
EPC	✓
TRABALHO EM ALTURA	✓
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	✓
EQUIPAMENTOS	✓

ADITIVOS

Breve Descrição	Valor ou Dias	Data de Apresentação	Data de Aprovação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ENCERRAMENTO

Atividade	Data Prevista	Data Realizada
Comunicação de término da obra	21/12/2027	-
Emissão TRP	05/01/2028	-
Emissão TRD	04/04/2028	
