RELATÓRIO GERENCIAL QUINZENAL - RGQ

IGREJA VERBO DA VIDA PETROLINA/PE

OBRA: CAP. 2 IGREJA DE JOVENS – PETROLINA/PE

CATEGORIA: IMPLANTAÇÃO

Periodicidade Quinzenal
Data de Publicação 14/10/2025
Quinzena Vigente 25Q20

ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Prazos de Obra	
Início:	29/04/2025
Término baseline:	14/12/2025
Término c/ aditivos:	
Término tendência	14/12/2025
Duração (dias)	230
Avanço Acumulado	
Previsto Baseline:	0%
Previsto c/ Aditivo:	0%
Crono Rev -:	0%
Realizado:	0%
Status:	✓
Controle de Medições	
Entrega da Medição nº 01	-
Nº de CCM's necessários	-
Envio da Medição Final	-
Aprovação da Medição	-

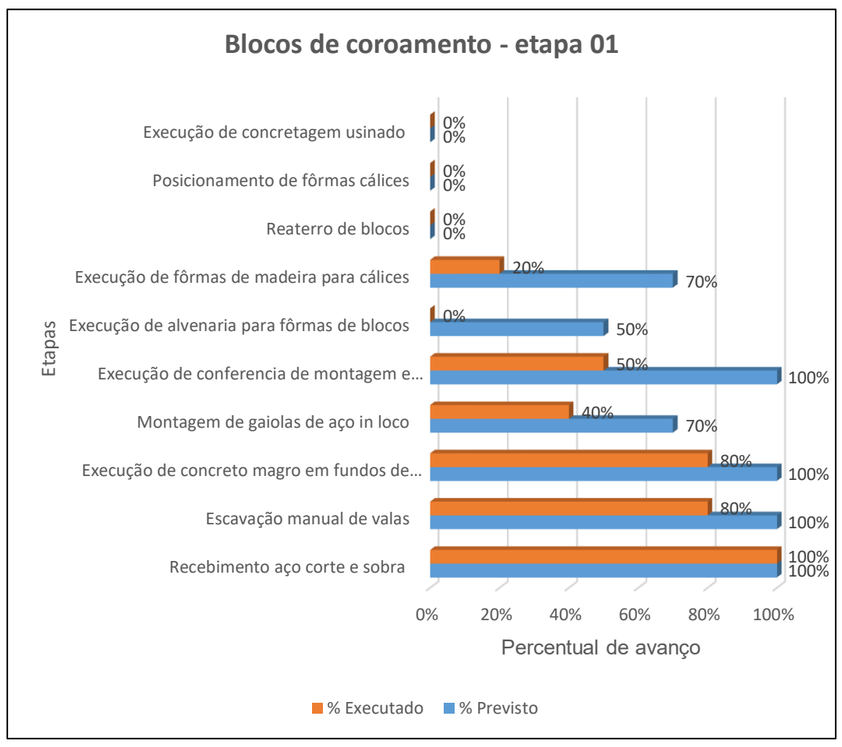

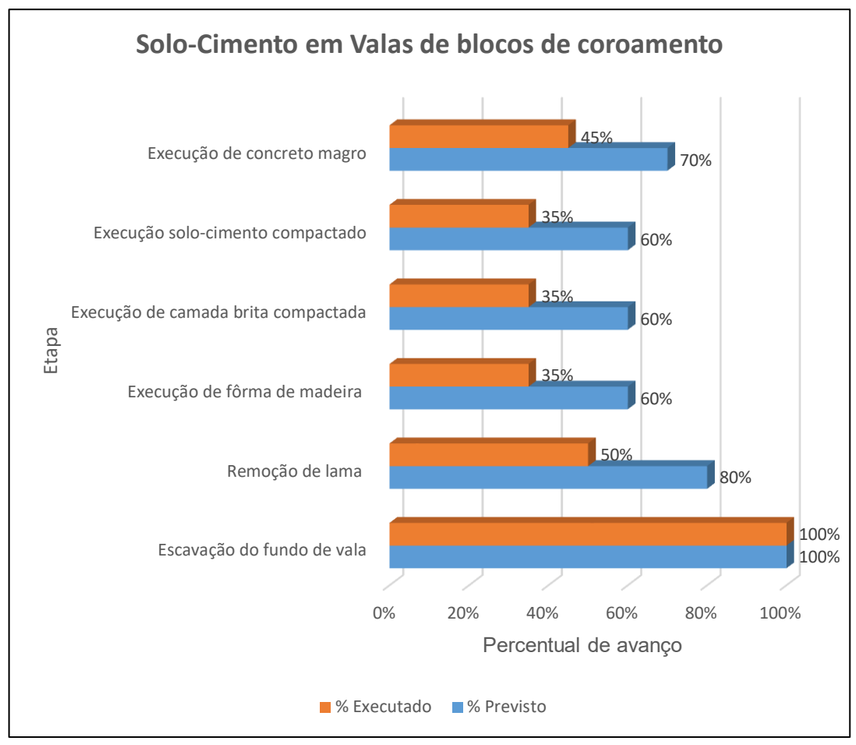

DIVERSOS

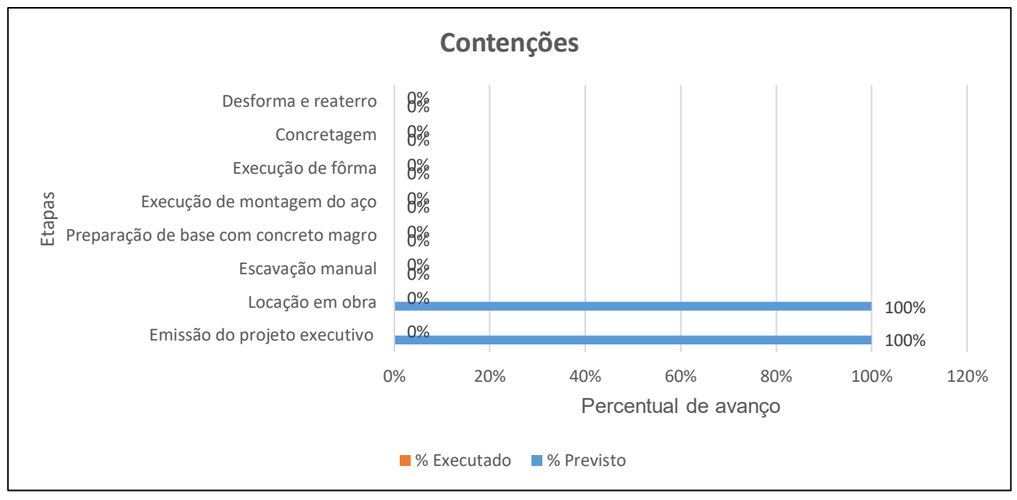

PONTOS DE ATENÇÃO

Farol	Assunto	Breve Descrição	Ações
▲	Licenças	- Alvará: emitido em 16/09/25 nº 8.701/2024. - Corpo de bombeiros: Necessária substituição após revisão do Masterplan. - Licença ambiental: Licença emitida. - Água e esgoto: Aguardando projeto de engenharia. - Energia: Aguardando memorial técnico de consumo. - Mobilidade urbana – AMMPLA: Licença emitida.	À equipe adm local segue monitorando os processos
●	Atividades	- Em canteiro, em andamento montagem do aço dos blocos de coroamento com profissional contratado pela igreja. Sequência na execução de solo-cimento onde há presença de água do lençol freático com a seguinte sequência: remoção da lama do fundo da vala, posicionamento da forma de madeira, execução de camada de pedra compactada, execução do solo-cimento compactado, execução de concreto magro. Sequência na revisão do gabarito da obra. Remoção de sobras de tubos e trilhos metálicos do canteiro. Rebaixamento de barreiras de forma manual.	Estamos aguardando a conclusão do projeto de contenções emitido pela empresa Maciel Engrenharia para andamento na etapa.□
●	Fornecedores	- Superestrutura: A empresa concluiu o projeto e enviou para arquitetura aprovar a o modelo para produção. - Projeto de Contenções: A Maciel Engenharia concluiu o modelo e está a enviar o projeto executivo nos próximos dias. - Pedro Marcio: Escritório responsável pelos projetos de engenharia está a enviar as versões final nos próximos dias.	Em 07 e 08 de outubro ocorreu a visita aos fornecedores e parceiros do cap 2 em salvador, realizada pelo eng Rafael e pastor Ronan.
